


PROJETO DE ARQUITETURA  
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE  
TUBO DE 200 MM DE DIÂMETRO  
EM 1000 M DE COMPRIMENTO



PROJETO DE ARQUITETURA  
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE  
TUBO DE 200 MM DE DIÂMETRO  
EM 1000 M DE COMPRIMENTO

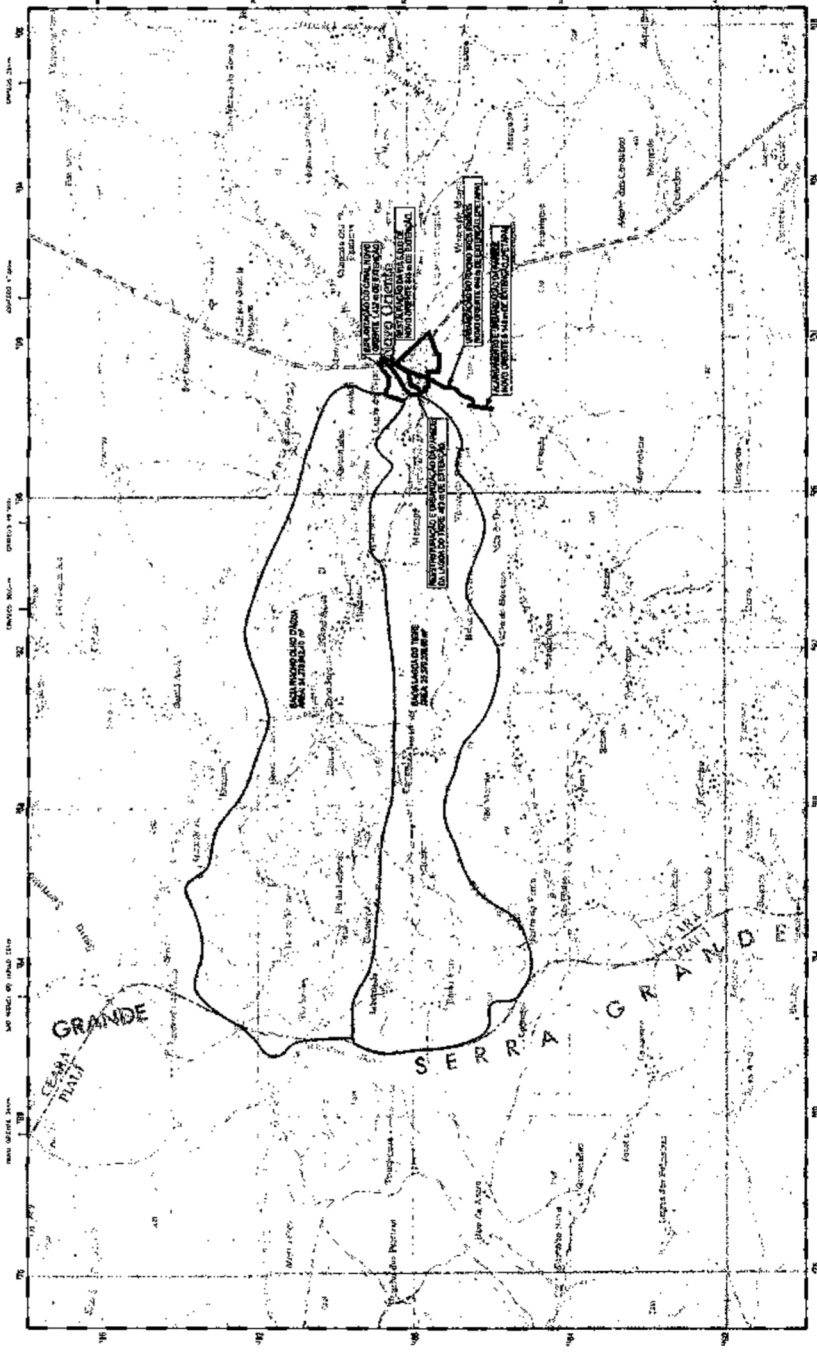

01.00 CARTOGRAFIA DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE

DADOS TÉCNICOS DO PROJETO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------|---------|------------|----------------|-------------|
| 1    | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 2    | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 3    | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 4    | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 5    | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 6    | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 7    | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 8    | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 9    | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 10   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 11   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 12   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 13   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 14   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 15   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 16   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 17   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 18   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 19   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 20   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 21   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 22   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 23   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 24   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 25   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 26   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 27   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 28   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 29   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 30   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 31   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 32   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 33   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 34   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 35   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 36   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 37   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 38   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 39   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 40   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 41   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 42   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 43   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 44   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 45   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 46   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 47   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 48   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 49   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 50   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 51   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 52   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 53   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 54   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 55   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 56   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 57   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 58   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 59   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 60   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 61   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 62   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 63   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 64   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 65   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 66   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 67   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 68   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 69   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 70   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 71   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 72   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 73   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 74   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 75   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 76   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 77   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 78   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 79   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 80   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 81   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 82   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 83   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 84   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 85   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 86   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 87   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 88   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 89   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 90   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 91   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 92   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 93   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 94   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 95   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 96   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 97   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 98   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 99   | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |
| 100  | ...       | ...     | ...        | ...            | ...         |




GERADO POR: [Software Name]


PROJETO DE: \_\_\_\_\_  
 CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 LOCAL: \_\_\_\_\_  
 DATA: \_\_\_\_\_



PROJETO DA OBRA DO GRUPO DE SERVIÇO DAS AGUAS  
 MUNICIPIO DE IPOJUCA  
 PRESTADOR MUNICIPAL DE BOMBA OBRATE  
 NOME DO CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 NOME DO PROJETO: \_\_\_\_\_  
 DATA DE EMISSÃO: 02/11  
 LOCAL: \_\_\_\_\_

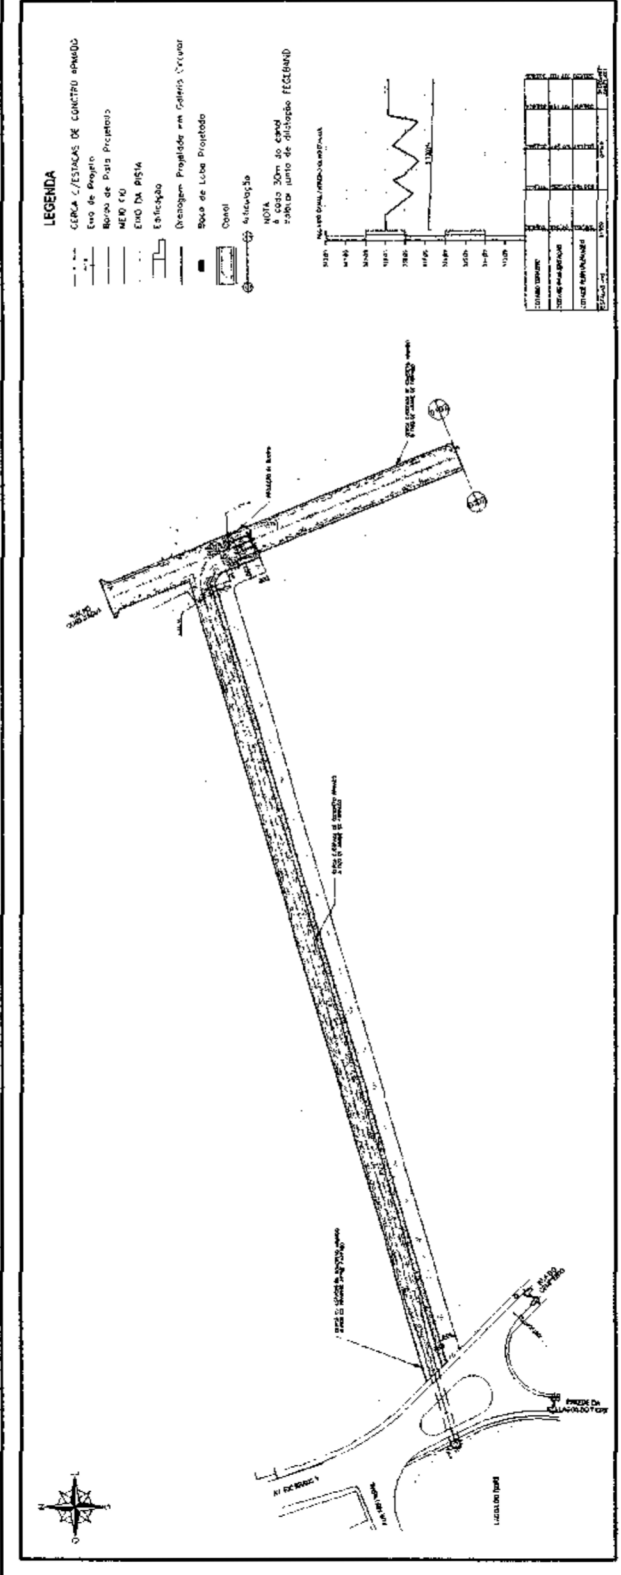


02.00 ALINHAMENTO CANAL

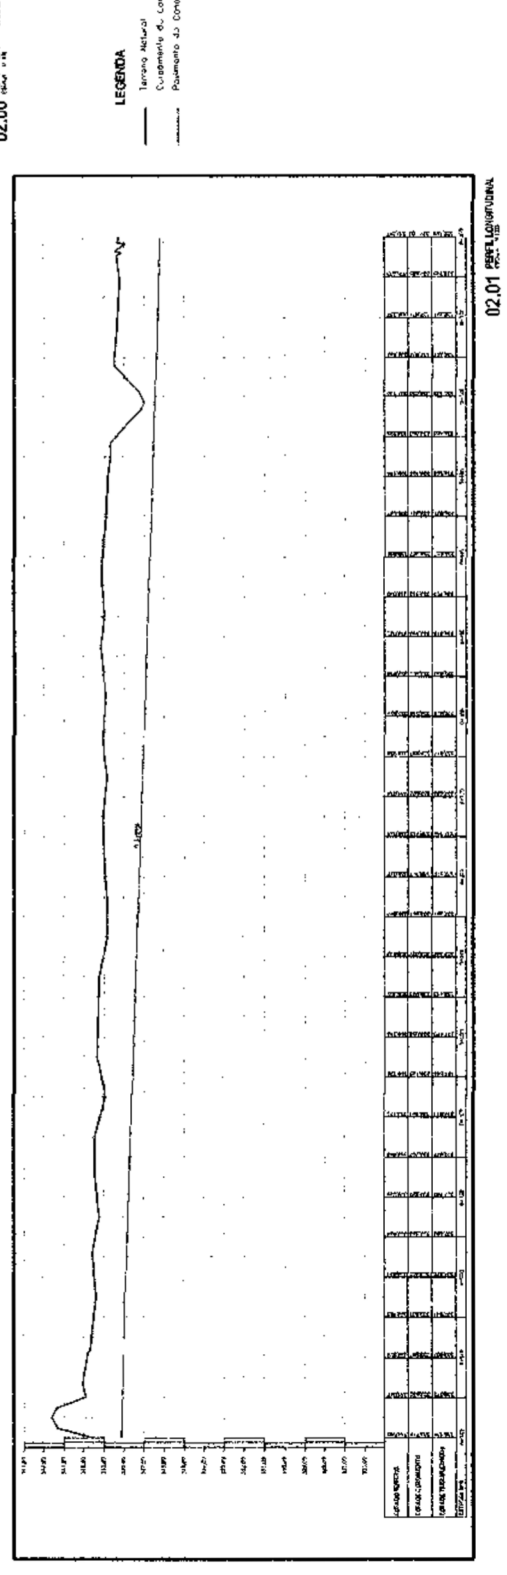


02.01 PERFIL ALINHAMENTO




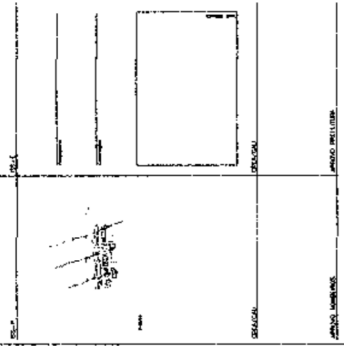

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PROJETO DE | PROJETO DE | PROJETO DE | PROJETO DE | PROJETO DE | PROJETO DE |
| 001        | 002        | 003        | 004        | 005        | 006        |
| 007        | 008        | 009        | 010        | 011        | 012        |
| 013        | 014        | 015        | 016        | 017        | 018        |
| 019        | 020        | 021        | 022        | 023        | 024        |
| 025        | 026        | 027        | 028        | 029        | 030        |
| 031        | 032        | 033        | 034        | 035        | 036        |
| 037        | 038        | 039        | 040        | 041        | 042        |
| 043        | 044        | 045        | 046        | 047        | 048        |
| 049        | 050        | 051        | 052        | 053        | 054        |
| 055        | 056        | 057        | 058        | 059        | 060        |
| 061        | 062        | 063        | 064        | 065        | 066        |
| 067        | 068        | 069        | 070        | 071        | 072        |
| 073        | 074        | 075        | 076        | 077        | 078        |
| 079        | 080        | 081        | 082        | 083        | 084        |
| 085        | 086        | 087        | 088        | 089        | 090        |
| 091        | 092        | 093        | 094        | 095        | 096        |
| 097        | 098        | 099        | 100        | 101        | 102        |
| 103        | 104        | 105        | 106        | 107        | 108        |
| 109        | 110        | 111        | 112        | 113        | 114        |
| 115        | 116        | 117        | 118        | 119        | 120        |
| 121        | 122        | 123        | 124        | 125        | 126        |
| 127        | 128        | 129        | 130        | 131        | 132        |
| 133        | 134        | 135        | 136        | 137        | 138        |
| 139        | 140        | 141        | 142        | 143        | 144        |
| 145        | 146        | 147        | 148        | 149        | 150        |
| 151        | 152        | 153        | 154        | 155        | 156        |
| 157        | 158        | 159        | 160        | 161        | 162        |
| 163        | 164        | 165        | 166        | 167        | 168        |
| 169        | 170        | 171        | 172        | 173        | 174        |
| 175        | 176        | 177        | 178        | 179        | 180        |
| 181        | 182        | 183        | 184        | 185        | 186        |
| 187        | 188        | 189        | 190        | 191        | 192        |
| 193        | 194        | 195        | 196        | 197        | 198        |
| 199        | 200        | 201        | 202        | 203        | 204        |
| 205        | 206        | 207        | 208        | 209        | 210        |
| 211        | 212        | 213        | 214        | 215        | 216        |
| 217        | 218        | 219        | 220        | 221        | 222        |
| 223        | 224        | 225        | 226        | 227        | 228        |
| 229        | 230        | 231        | 232        | 233        | 234        |
| 235        | 236        | 237        | 238        | 239        | 240        |
| 241        | 242        | 243        | 244        | 245        | 246        |
| 247        | 248        | 249        | 250        | 251        | 252        |
| 253        | 254        | 255        | 256        | 257        | 258        |
| 259        | 260        | 261        | 262        | 263        | 264        |
| 265        | 266        | 267        | 268        | 269        | 270        |
| 271        | 272        | 273        | 274        | 275        | 276        |
| 277        | 278        | 279        | 280        | 281        | 282        |
| 283        | 284        | 285        | 286        | 287        | 288        |
| 289        | 290        | 291        | 292        | 293        | 294        |
| 295        | 296        | 297        | 298        | 299        | 300        |
| 301        | 302        | 303        | 304        | 305        | 306        |
| 307        | 308        | 309        | 310        | 311        | 312        |
| 313        | 314        | 315        | 316        | 317        | 318        |
| 319        | 320        | 321        | 322        | 323        | 324        |
| 325        | 326        | 327        | 328        | 329        | 330        |
| 331        | 332        | 333        | 334        | 335        | 336        |
| 337        | 338        | 339        | 340        | 341        | 342        |
| 343        | 344        | 345        | 346        | 347        | 348        |
| 349        | 350        | 351        | 352        | 353        | 354        |
| 355        | 356        | 357        | 358        | 359        | 360        |
| 361        | 362        | 363        | 364        | 365        | 366        |
| 367        | 368        | 369        | 370        | 371        | 372        |
| 373        | 374        | 375        | 376        | 377        | 378        |
| 379        | 380        | 381        | 382        | 383        | 384        |
| 385        | 386        | 387        | 388        | 389        | 390        |
| 391        | 392        | 393        | 394        | 395        | 396        |
| 397        | 398        | 399        | 400        | 401        | 402        |
| 403        | 404        | 405        | 406        | 407        | 408        |
| 409        | 410        | 411        | 412        | 413        | 414        |
| 415        | 416        | 417        | 418        | 419        | 420        |
| 421        | 422        | 423        | 424        | 425        | 426        |
| 427        | 428        | 429        | 430        | 431        | 432        |
| 433        | 434        | 435        | 436        | 437        | 438        |
| 439        | 440        | 441        | 442        | 443        | 444        |
| 445        | 446        | 447        | 448        | 449        | 450        |
| 451        | 452        | 453        | 454        | 455        | 456        |
| 457        | 458        | 459        | 460        | 461        | 462        |
| 463        | 464        | 465        | 466        | 467        | 468        |
| 469        | 470        | 471        | 472        | 473        | 474        |
| 475        | 476        | 477        | 478        | 479        | 480        |
| 481        | 482        | 483        | 484        | 485        | 486        |
| 487        | 488        | 489        | 490        | 491        | 492        |
| 493        | 494        | 495        | 496        | 497        | 498        |
| 499        | 500        | 501        | 502        | 503        | 504        |
| 505        | 506        | 507        | 508        | 509        | 510        |
| 511        | 512        | 513        | 514        | 515        | 516        |
| 517        | 518        | 519        | 520        | 521        | 522        |
| 523        | 524        | 525        | 526        | 527        | 528        |
| 529        | 530        | 531        | 532        | 533        | 534        |
| 535        | 536        | 537        | 538        | 539        | 540        |
| 541        | 542        | 543        | 544        | 545        | 546        |
| 547        | 548        | 549        | 550        | 551        | 552        |
| 553        | 554        | 555        | 556        | 557        | 558        |
| 559        | 560        | 561        | 562        | 563        | 564        |
| 565        | 566        | 567        | 568        | 569        | 570        |
| 571        | 572        | 573        | 574        | 575        | 576        |
| 577        | 578        | 579        | 580        | 581        | 582        |
| 583        | 584        | 585        | 586        | 587        | 588        |
| 589        | 590        | 591        | 592        | 593        | 594        |
| 595        | 596        | 597        | 598        | 599        | 600        |
| 601        | 602        | 603        | 604        | 605        | 606        |
| 607        | 608        | 609        | 610        | 611        | 612        |
| 613        | 614        | 615        | 616        | 617        | 618        |
| 619        | 620        | 621        | 622        | 623        | 624        |
| 625        | 626        | 627        | 628        | 629        | 630        |
| 631        | 632        | 633        | 634        | 635        | 636        |
| 637        | 638        | 639        | 640        | 641        | 642        |
| 643        | 644        | 645        | 646        | 647        | 648        |
| 649        | 650        | 651        | 652        | 653        | 654        |
| 655        | 656        | 657        | 658        | 659        | 660        |
| 661        | 662        | 663        | 664        | 665        | 666        |
| 667        | 668        | 669        | 670        | 671        | 672        |
| 673        | 674        | 675        | 676        | 677        | 678        |
| 679        | 680        | 681        | 682        | 683        | 684        |
| 685        | 686        | 687        | 688        | 689        | 690        |
| 691        | 692        | 693        | 694        | 695        | 696        |
| 697        | 698        | 699        | 700        | 701        | 702        |
| 703        | 704        | 705        | 706        | 707        | 708        |
| 709        | 710        | 711        | 712        | 713        | 714        |
| 715        | 716        | 717        | 718        | 719        | 720        |
| 721        | 722        | 723        | 724        | 725        | 726        |
| 727        | 728        | 729        | 730        | 731        | 732        |
| 733        | 734        | 735        | 736        | 737        | 738        |
| 739        | 740        | 741        | 742        | 743        | 744        |
| 745        | 746        | 747        | 748        | 749        | 750        |
| 751        | 752        | 753        | 754        | 755        | 756        |
| 757        | 758        | 759        | 760        | 761        | 762        |
| 763        | 764        | 765        | 766        | 767        | 768        |
| 769        | 770        | 771        | 772        | 773        | 774        |
| 775        | 776        | 777        | 778        | 779        | 780        |
| 781        | 782        | 783        | 784        | 785        | 786        |
| 787        | 788        | 789        | 790        | 791        | 792        |
| 793        | 794        | 795        | 796        | 797        | 798        |
| 799        | 800        | 801        | 802        | 803        | 804        |
| 805        | 806        | 807        | 808        | 809        | 810        |
| 811        | 812        | 813        | 814        | 815        | 816        |
| 817        | 818        | 819        | 820        | 821        | 822        |
| 823        | 824        | 825        | 826        | 827        | 828        |
| 829        | 830        | 831        | 832        | 833        | 834        |
| 835        | 836        | 837        | 838        | 839        | 840        |
| 841        | 842        | 843        | 844        | 845        | 846        |
| 847        | 848        | 849        | 850        | 851        | 852        |
| 853        | 854        | 855        | 856        | 857        | 858        |
| 859        | 860        | 861        | 862        | 863        | 864        |
| 865        | 866        | 867        | 868        | 869        | 870        |
| 871        | 872        | 873        | 874        | 875        | 876        |
| 877        | 878        | 879        | 880        | 881        | 882        |
| 883        | 884        | 885        | 886        | 887        | 888        |
| 889        | 890        | 891        | 892        | 893        | 894        |
| 895        | 896        | 897        | 898        | 899        | 900        |
| 901        | 902        | 903        | 904        | 905        | 906        |
| 907        | 908        | 909        | 910        | 911        | 912        |
| 913        | 914        | 915        | 916        | 917        | 918        |
| 919        | 920        | 921        | 922        | 923        | 924        |
| 925        | 926        | 927        | 928        | 929        | 930        |
| 931        | 932        | 933        | 934        | 935        | 936        |
| 937        | 938        | 939        | 940        | 941        | 942        |
| 943        | 944        | 945        | 946        | 947        | 948        |
| 949        | 950        | 951        | 952        | 953        | 954        |
| 955        | 956        | 957        | 958        | 959        | 960        |
| 961        | 962        | 963        | 964        | 965        | 966        |
| 967        | 968        | 969        | 970        | 971        | 972        |
| 973        | 974        | 975        | 976        | 977        | 978        |
| 979        | 980        | 981        | 982        | 983        | 984        |
| 985        | 986        | 987        | 988        | 989        | 990        |
| 991        | 992        | 993        | 994        | 995        | 996        |
| 997        | 998        | 999        | 1000       |            |            |

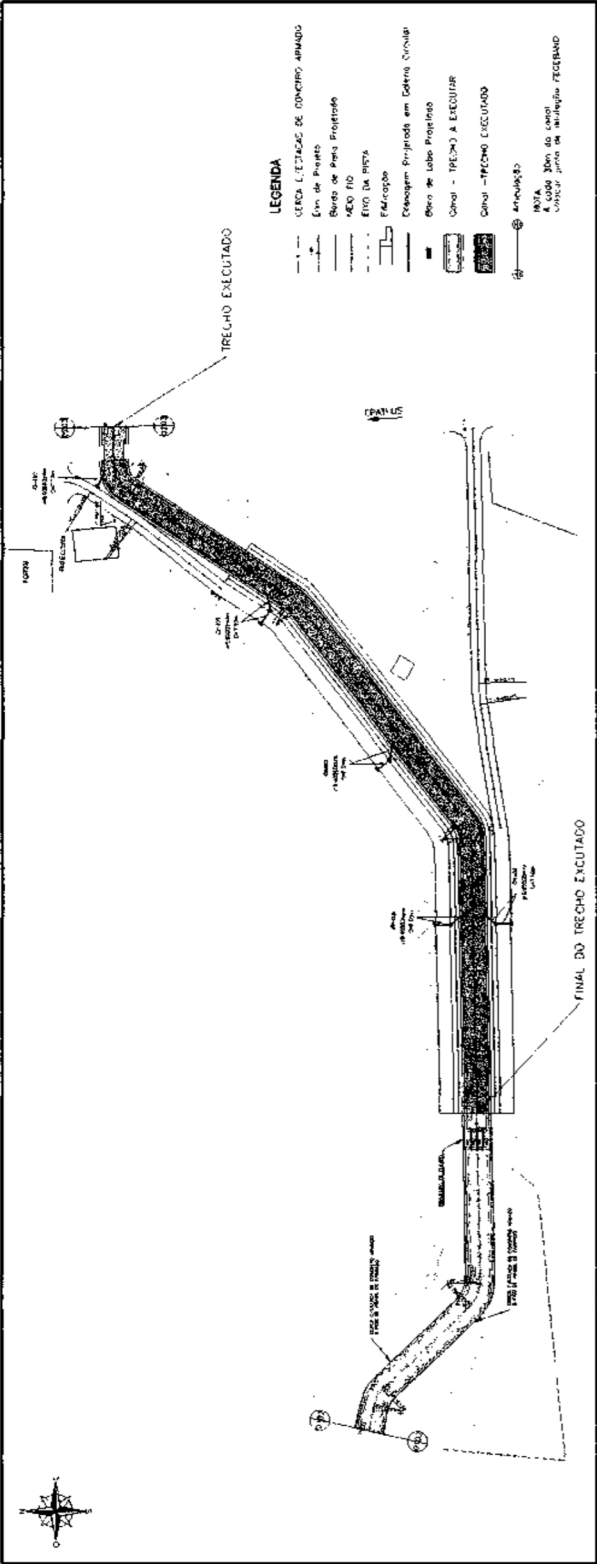

03.00 ALINHADA-CANAL

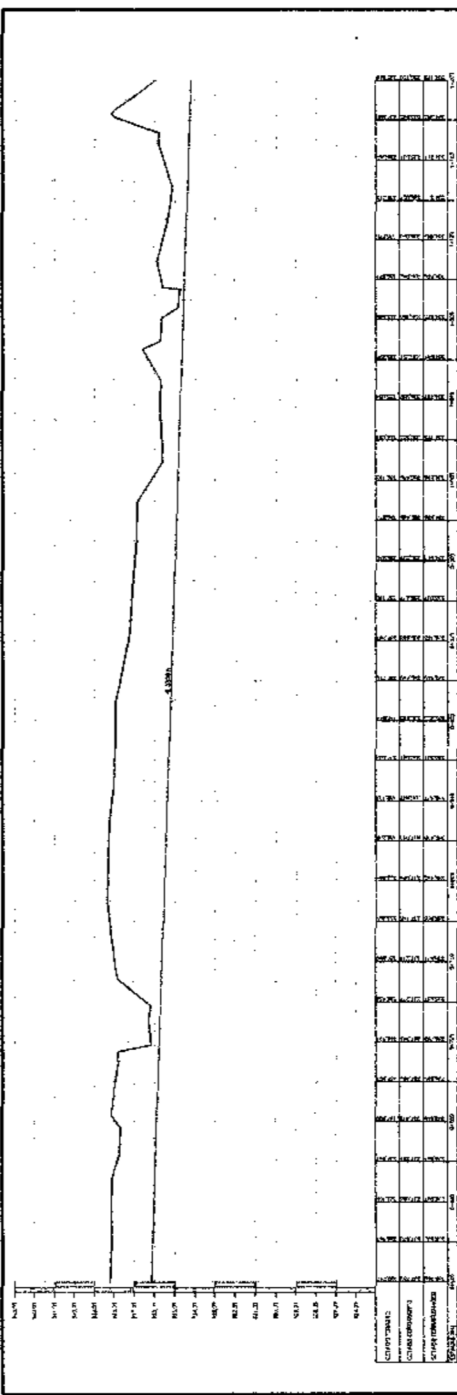

03.01 PERFIL LONGITUDINAL



**Tibipina**  
SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO

PROPOSTA DE PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO  
MUNICÍPIO DE TIBIPINA - PE  
PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO - ETAPA DE PROJETO BÁSICO

REGIÃO: \_\_\_\_\_  
LOCALIDADE: \_\_\_\_\_  
PROJETO: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_






PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO DO CANAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ÁGUAS NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE

PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO - ETAPA DE PROJETO BÁSICO

PROJETO: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_


PROJETADEOR: \_\_\_\_\_  
PROJETADEORA: \_\_\_\_\_  
PROJETADEOR: \_\_\_\_\_

PROJETO: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_




05.03 DETALHE DE TRANSIÇÃO DA PISTA E CALÇADA

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------|------------|---------|----------------|-------------|
| 1    | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 2    | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 3    | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 4    | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 5    | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 6    | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 7    | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 8    | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 9    | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 10   | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 11   | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 12   | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 13   | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 14   | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 15   | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 16   | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 17   | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 18   | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 19   | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |
| 20   | ...       | ...        | ...     | ...            | ...         |

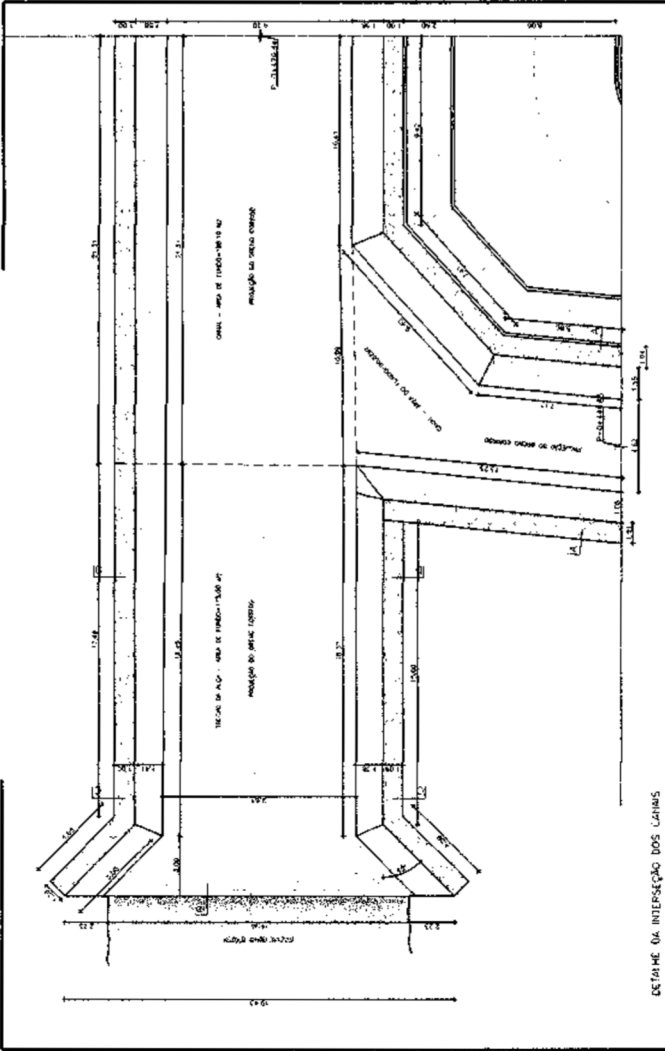


DETALHE NA INTERSEÇÃO DOS CANAIS


05.00 PLANTA BARRA - DETALHE DE TRANSIÇÃO DA ALÇA DO CANAL

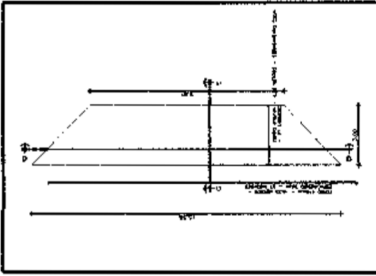


05.04 VISTA FRONTAL DA ALÇA DO CANAL




05.05 CORTA AA - SEÇÃO TRAPEZOIDAL



05.07 CORTA CC - SEÇÃO TRAPEZOIDAL

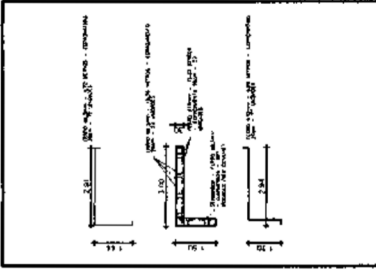

05.08 DETALHES DE ARMADURA



05.09 DETALHE DE ARMADURA

PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO DO CANAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ÁGUAS NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE

PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO - ETAPA DE PROJETO BÁSICO

PROJETO: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

PROJETADEOR: \_\_\_\_\_  
PROJETADEORA: \_\_\_\_\_  
PROJETADEOR: \_\_\_\_\_

PROJETO: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

SE-1  
 SE-2  
 SE-3




SE-4  
 SE-5




|           |  |
|-----------|--|
| PROJETO   | PROJETO DA OBRAS DO CANAL DE DESVIO DAS ÁGUAS NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE |
| CLIENTE   | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE                                       |
| LOCAL     | NOVO ORIENTE - CE  |
| PROJETO   | DETALHES - SEÇÕES TRANSVERSAIS TPO   |
| PROJETADE | ILBIAPINA  |
| DATA      | 06/11  |


**SEÇÃO TIPO 03 - (SEÇÃO PLENA)**  
 (de 0+440 ao 0+470)



**SEÇÃO TIPO 02 - (SEÇÃO PLENA)**  
 (de 0+80 ao 0+140)



**SEÇÃO TIPO 01 - (SEÇÃO PLENA)**  
 (de 0+140 ao 0+180)



**Ilbiapina**  
 RUA: 1157 - DWS 78-4315

Arquiteto: Paulo Roberto de Souza  
 Engenheiro: Roberto de Souza  
 Rua: 1157 - DWS 78-4315

PROJETO: \_\_\_\_\_  
 LOCAL: \_\_\_\_\_  
 DATA: \_\_\_\_\_  
 ESCALA: \_\_\_\_\_  
 APROVADO: \_\_\_\_\_




PROJETO: \_\_\_\_\_  
 LOCAL: \_\_\_\_\_  
 DATA: \_\_\_\_\_  
 ESCALA: \_\_\_\_\_  
 APROVADO: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE**  
 NOVO ORIENTE - CE  
 DETALHES DE TRANSVERSAL DO CANAL PRINCIPAL  
 PROJETO DE ARQUITETURA

PROJETO: \_\_\_\_\_  
 LOCAL: \_\_\_\_\_  
 DATA: \_\_\_\_\_  
 ESCALA: \_\_\_\_\_  
 APROVADO: \_\_\_\_\_

07/11

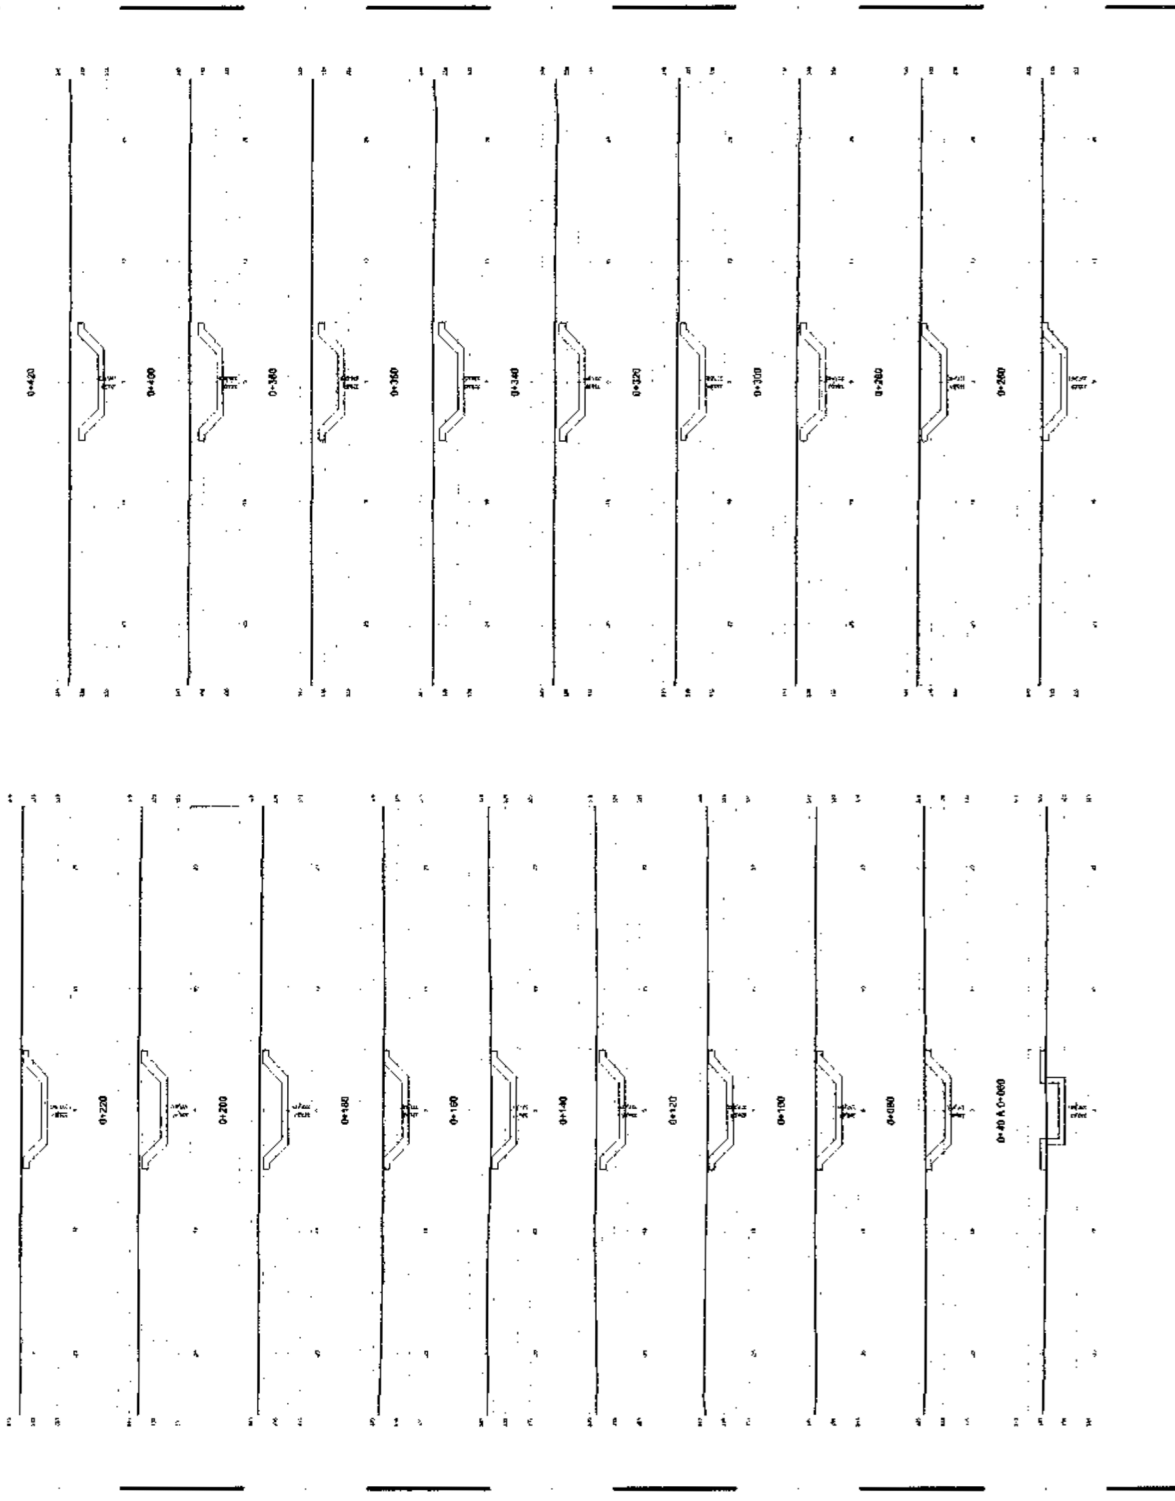

07.00 SEÇÕES TRANSVERSAIS DO EWO PRINCIPAL




|          |   |
|----------|---|
| PROJETO  | PROJETO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE |
| PROPOSTA | PROPOSTA Nº 001/2008  |
| PROJETO  | PROJETO Nº 001/2008   |
| PROPOSTA | PROPOSTA Nº 001/2008  |
| PROJETO  | PROJETO Nº 001/2008   |
| PROPOSTA | PROPOSTA Nº 001/2008  |
| PROJETO  | PROJETO Nº 001/2008   |
| PROPOSTA | PROPOSTA Nº 001/2008  |




|          |                      |
|----------|----------------------|
| PROJETO  | PROJETO Nº 001/2008  |
| PROPOSTA | PROPOSTA Nº 001/2008 |
| PROJETO  | PROJETO Nº 001/2008  |
| PROPOSTA | PROPOSTA Nº 001/2008 |
| PROJETO  | PROJETO Nº 001/2008  |
| PROPOSTA | PROPOSTA Nº 001/2008 |
| PROJETO  | PROJETO Nº 001/2008  |
| PROPOSTA | PROPOSTA Nº 001/2008 |

PROJETO Nº 001/2008  
PROPOSTA Nº 001/2008

09/11

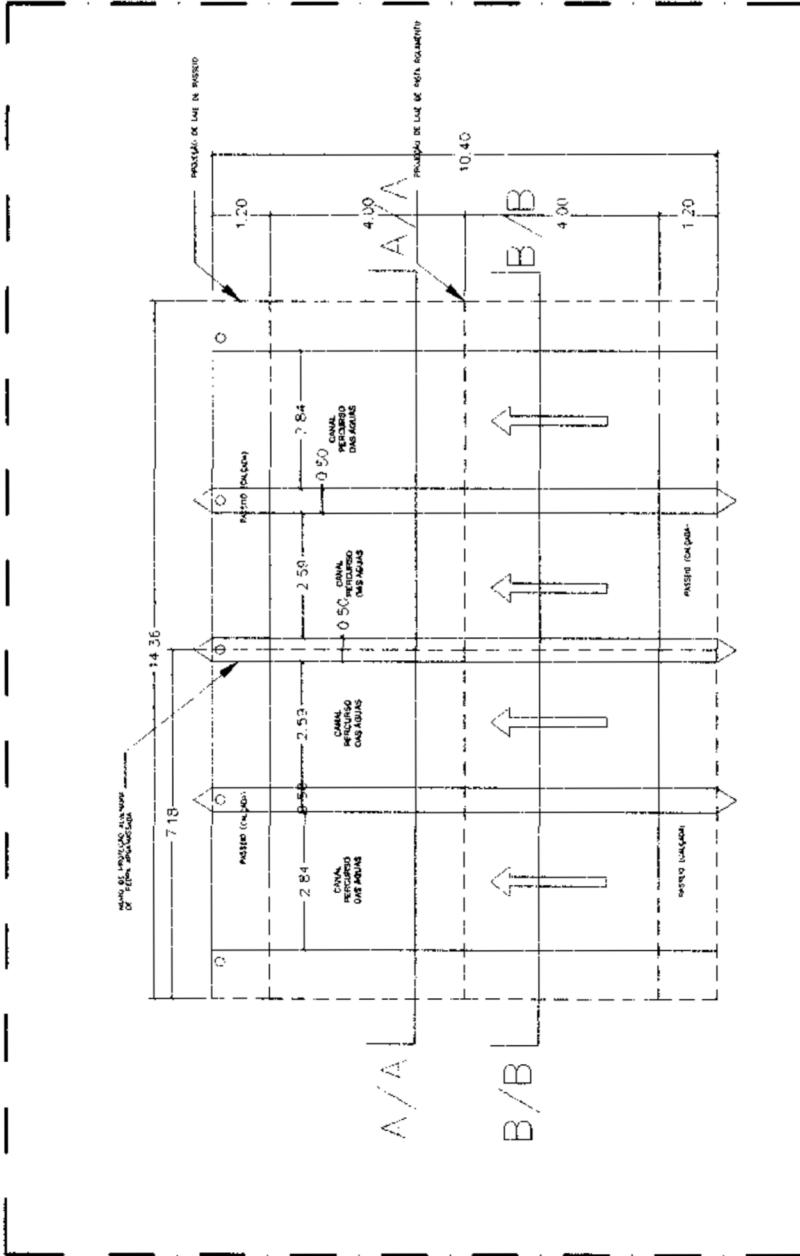

09.00 PLANTA BAIXA - BUEIRO






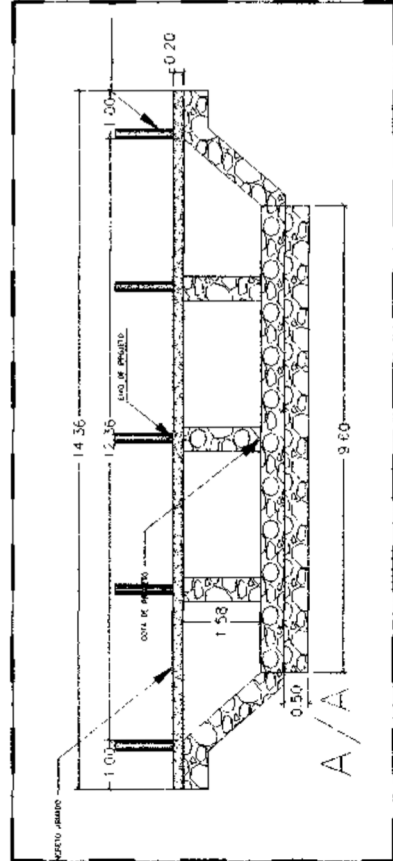


09.01 CORTE AA - BUEIRO

|           |   |
|-----------|---|
| PROJETO   | PROJETO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAÇÃO DO BARRIO DO BUEIRO |
| CLIENTE   | MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE  |
| PROJETADE | DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA   |
| PROJETO   | PROJETO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAÇÃO DO BARRIO DO BUEIRO |
| PROJETADE | DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA   |
| PROJETO   | PROJETO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAÇÃO DO BARRIO DO BUEIRO |
| PROJETADE | DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA   |



|           |   |
|-----------|---|
| PROJETO   | PROJETO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAÇÃO DO BARRIO DO BUEIRO |
| CLIENTE   | MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE  |
| PROJETADE | DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA   |
| PROJETO   | PROJETO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAÇÃO DO BARRIO DO BUEIRO |
| PROJETADE | DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA   |
| PROJETO   | PROJETO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAÇÃO DO BARRIO DO BUEIRO |
| PROJETADE | DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA   |
| PROJETO   | PROJETO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAÇÃO DO BARRIO DO BUEIRO |
| PROJETADE | DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA   |

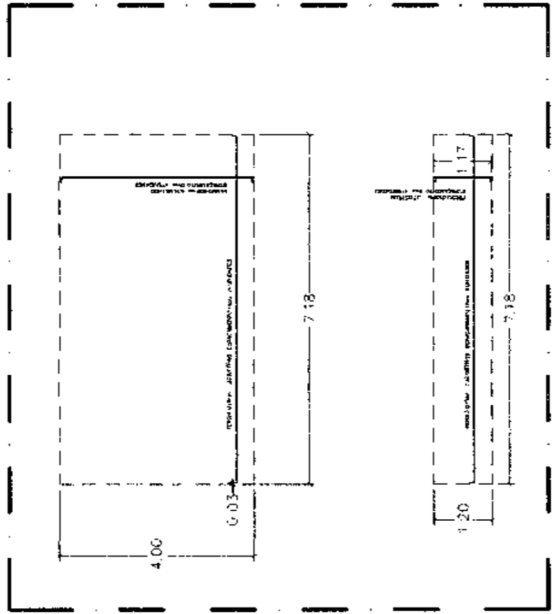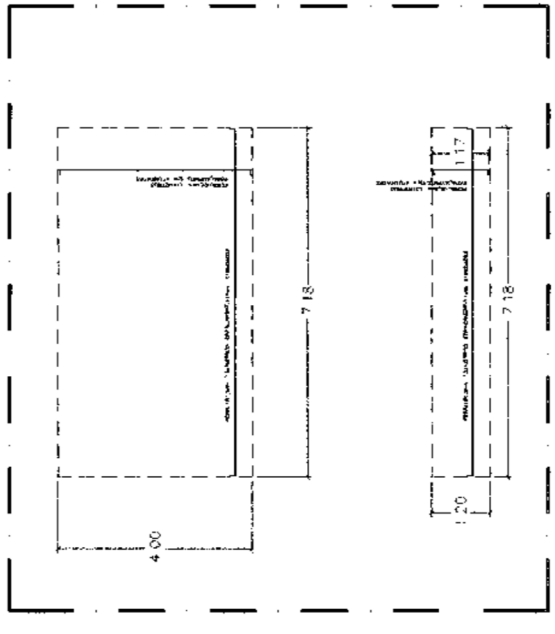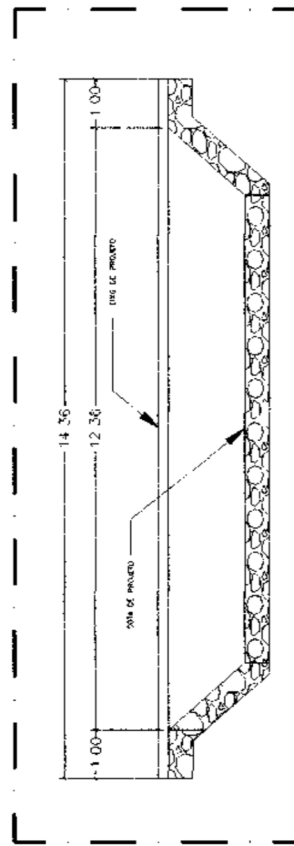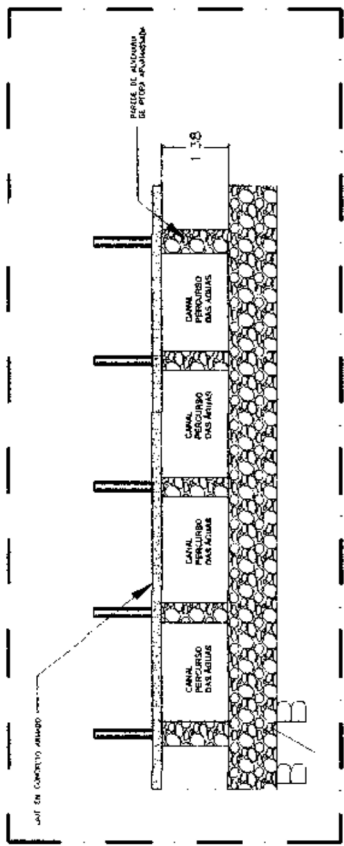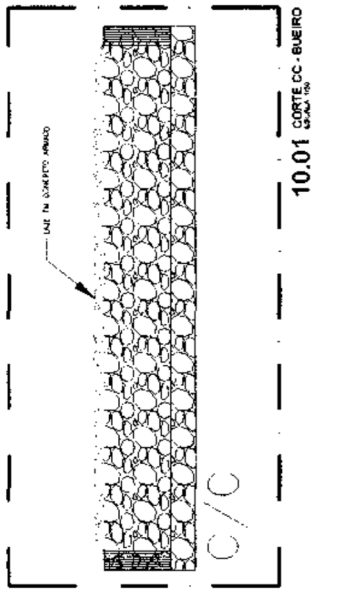






**Ilbiopina**  
 Engenharia e Arquitetura

Projeto de Engenharia e Arquitetura



PROJETO DA BARRAGEM DO CANAL DE DERRAMA DAS ÁGUAS VIVAS  
 MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE

|              |   |
|--------------|---|
| PROJETO      | PROJETO DE BARRAGEM DO CANAL DE DERRAMA DAS ÁGUAS VIVAS |
| CLIENTE      | MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE                               |
| PROJETADEIRO | ILBIOPINA ENGENHARIA E ARQUITETURA                      |
| DATA         | 11/11   |

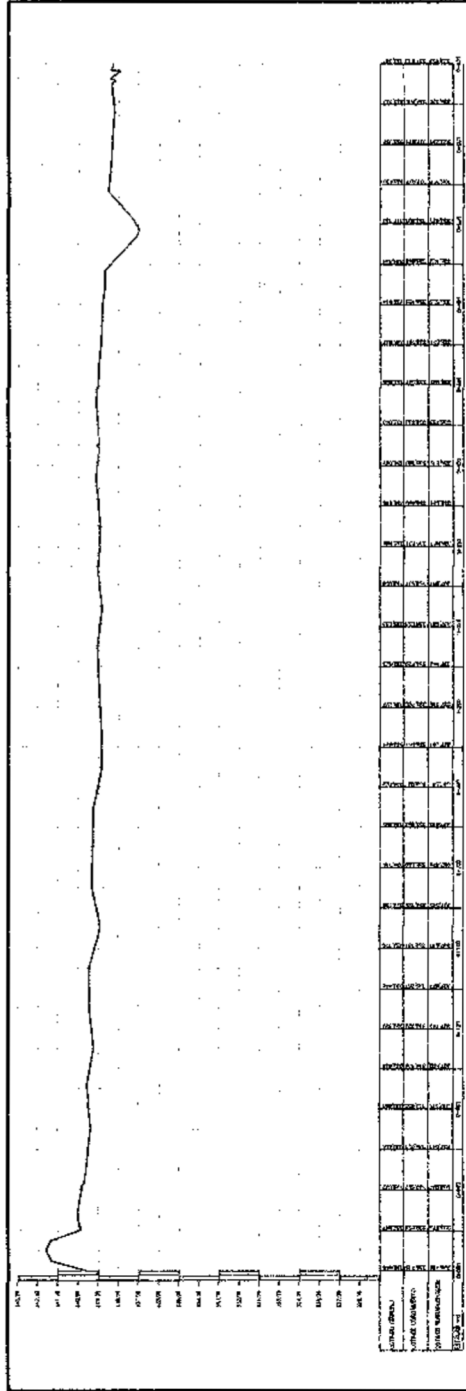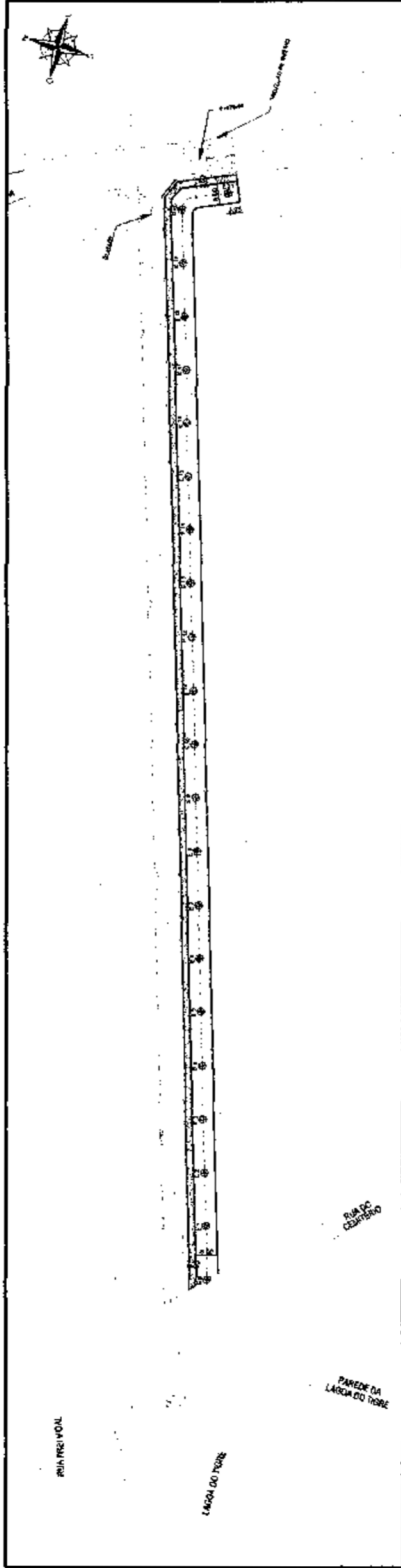



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE



Página 1/3

ART ORDEM SERVIÇO  
Nº CE20220954874

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à  
CE20220954547

1. Responsável Técnico

FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA RODRIGUES DE CARVALHO

Título profissional: TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACOES, ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0607762110

Registro: 44031CE

Empresa contratada: IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Registro: 0000397687-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE

CPF/CNPJ: 07.982.010/0001-19

RUA DEOCLECIANO ARAGÃO

Nº: 15

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Novo Oriente

UF: CE

CEP: 63740000

Contrato: 00.001.2022.1

Celebrado em: 03/03/2022

Valor: R\$ 1.000.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DEOCLECIANO ARAGÃO

Nº: 15

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Novo Oriente

UF: CE

CEP: 63740000

Data de Início: 17/03/2022

Previsão de término: 03/03/2023

Coordenadas Geográficas: -5.536514, -40.774803

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE

CPF/CNPJ: 07.982.010/0001-19

4. Atividade Técnica

| 14 - Elaboração  | Quantidade | Unidade |
|--|------------|---------|
| 80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO                                  | 1,00       | un      |
| 80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.4 - DE NIVELAMENTOS ALTIMÉTRICOS BÁSICOS  | 1,00       | un      |
| 80 - Projeto > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO  | 1,00       | un      |
| 80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO  | 1,00       | un      |
| 80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE  | 1,00       | un      |
| 80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO                                       | 1,00       | un      |
| 80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM  | 1,00       | un      |
| 80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA                  | 1,00       | un      |
| 80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO > DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO > #3.5.1.6 - POR DRENOS HORIZONTAIS | 1,00       | un      |
| 80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA  | 1,00       | un      |
| 80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.3 - CANAL   | 1,00       | un      |
| 35 - Elaboração de orçamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO                  | 1,00       | un      |
| 35 - Elaboração de orçamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.4 - DE NIVELAMENTOS ALTIMÉTRICOS BÁSICOS                              | 1,00       | un      |
| 35 - Elaboração de orçamento > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO  | 1,00       | un      |
| 35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO                                | 1,00       | un      |

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B2wDz  
Impresso em: 31/03/2022 às 15:35:01 por: ip: 189.26.102.86





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à  
 CE20220954547

|  |      |    |
|--|------|----|
| 35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE  | 1,00 | un |
| 35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO                                       | 1,00 | un |
| 35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM  | 1,00 | un |
| 35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA                  | 1,00 | un |
| 35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO > DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO > #3.5.1.6 - POR DRENOS HORIZONTAIS | 1,00 | un |
| 35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA  | 1,00 | un |
| 35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.3 - CANAL   | 1,00 | un |
| 72 - Orientação técnica > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO                                       | 1,00 | un |
| 72 - Orientação técnica > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.4 - DE NIVELAMENTOS ALTIMÉTRICOS BÁSICOS   | 1,00 | un |
| 72 - Orientação técnica > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO   | 1,00 | un |
| 72 - Orientação técnica > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO   | 1,00 | un |
| 72 - Orientação técnica > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE   | 1,00 | un |
| 72 - Orientação técnica > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO  | 1,00 | un |
| 72 - Orientação técnica > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM   | 1,00 | un |
| 72 - Orientação técnica > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA                       | 1,00 | un |
| 72 - Orientação técnica > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO > DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO > #3.5.1.6 - POR DRENOS HORIZONTAIS      | 1,00 | un |
| 72 - Orientação técnica > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA   | 1,00 | un |
| 72 - Orientação técnica > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.3 - CANAL        | 1,00 | un |
| 18 - Fiscalização  |      |    |
| 60 - Fiscalização da obra > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO                                     | 1,00 | un |
| 60 - Fiscalização da obra > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.4 - DE NIVELAMENTOS ALTIMÉTRICOS BÁSICOS   | 1,00 | un |
| 60 - Fiscalização da obra > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO   | 1,00 | un |
| 60 - Fiscalização da obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO   | 1,00 | un |
| 60 - Fiscalização da obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE   | 1,00 | un |
| 60 - Fiscalização da obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO  | 1,00 | un |
| 60 - Fiscalização da obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM   | 1,00 | un |
| 60 - Fiscalização da obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA                     | 1,00 | un |
| 60 - Fiscalização da obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO > DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO > #3.5.1.6 - POR DRENOS HORIZONTAIS    | 1,00 | un |
| 60 - Fiscalização da obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA   | 1,00 | un |





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**



ART OBRA / SERVIÇO  
Nº 8220954874

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

COMPLEMENTAR à  
CE20220954547

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.3 - CANAL

1,00 UR

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CANAL DE DESVIO DAS ÁGUAS NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

FRANCISCO GILBERTO DIAPINA ROSINHOES DE CARVALHO - CPF: 957.966.973-15

*Francisco Gilberto Diapina Rosinões de Carvalho*

MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CNPJ: 07.982.010/0001-19

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 18/03/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8215247955

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave B2wDz  
Impresso em: 31/03/2022 às 15:35:02 por: , ip: 189.25.102.86



Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão  
CEP: 60861-211 - Fortaleza, Ceará, Brasil  
CNPJ: 33.866.288/0001-30  
Fone: (85) 3108 2800 / 3108.2803

**SOP-CE**  
SUPERINTENDÊNCIA  
DE OBRAS PÚBLICAS



**CEARÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DAS CIDADES



**CONVÊNIO Nº 105/2022**

**PROCESSO Nº 02797194/2022**

**MAPP: 1852**

**CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS -  
SOP E O MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE-CE,  
PARA OS FINS QUE ABAIXO SE DECLARA:**

A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP, inscrita no CNPJ nº 33.866.288/0001-30, com sede na Av. Alberto Craveiro, nº 2775 - Térreo, Castelão, Fortaleza-CE, CEP 60861-211, neste ato representada por seu Superintendente, Sr. FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador de Identidade nº 82758 (SSP-CE) e do CPF nº 144.324.043-63, residente e domiciliado na Rua Professor Jacinto Botelho, nº 290, apto. 502, Guararapes, Fortaleza-CE, CEP 60810-050, doravante denominado(a) **CONCEDENTE**, e o MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE-CE, inscrito no CNPJ nº 07.982.010/0001-19, com sede na Rua Deocleciano Aragão, nº 15, Centro, Novo Oriente-CE, CEP 63740-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JESUÍNO RODRIGUES DE SAMPAIO NETO, brasileiro, casado, portador de identidade nº 91002010848 (SSPDC-CE) e do CPF nº 778.018.573-72, residente e domiciliado na Rua Frei Vidal, nº 53, Vila Feliz, Novo Oriente-CE CEP 63740-000, doravante denominado **CONVENIENTE** resolvem celebrar o presente **CONVÊNIO**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO**

Com fundamento no que dispõe na Constituição Federal; Constituição do Estado do Ceará; Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações; na Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012, e suas alterações; no Decreto Estadual nº 32.811, de 28/09/2018, e suas alterações; na Lei Orçamentária Anual nº 17.364/2020, bem como em outros instrumentos legais pertinentes, mediante as cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

Constitui objeto deste Convênio a realização da **OBRA DO CANAL DE DESVIO DAS ÁGUAS, NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE-CE**, em conformidade com o Plano de Trabalho e seus Anexos, aprovado pelo Concedente, elaborados para esse fim, projetos, orçamentos e demais elementos consubstanciados nos autos do processo em referência, os quais passam a fazer parte integrante do presente Instrumento, independentemente de transcrição.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES**

#### **PARÁGRAFO PRIMEIRO – DO CONCEDENTE:**

- I) Aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à execução do objeto deste Convênio;
- II) Transferir os recursos financeiros para execução deste Convênio na forma do cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, observadas a disponibilidade financeira, as normas legais pertinentes, bem como o disposto no regulamento;
- III) Prorrogar "de ofício" a vigência deste Convênio quando houver atraso na liberação dos recursos motivado pelo CONCEDENTE através de apostilamento, limitada, a prorrogação, ao exato período do atraso verificado;
- IV) Orientar, coordenar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução deste Convênio diretamente ou por meio de órgão próprio, conforme o disposto na Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012, e alterações, e na forma do regulamento;
- V) Dar publicidade da íntegra deste Convênio e de seus possíveis aditivos e apostilamentos, conforme o disposto na Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012, e alterações;
- VI) Encaminhar o extrato deste Convênio e de seus possíveis aditivos, para publicação na imprensa oficial;
- VII) Dar ciência da assinatura deste Convênio à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na forma do disposto na Lei Complementar nº 119, de 28/12/2012, e alterações;
- VIII) Designar os responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização deste Convênio;
- IX) Analisar a prestação de contas final deste Convênio, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação desta pelo CONVENENTE;
- X) Instaurar Tomada de Contas Especial, na forma e de acordo com as situações previstas na Lei Complementar nº 119, de 28/12/2012, e alterações.

#### **PARÁGRAFO SEGUNDO – DO CONVENENTE:**

- I) Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto a que alude este Convênio, observando prazos, custos, metas a serem atingidas, as etapas ou fases de execução, o plano de aplicação dos recursos financeiros, o cronograma de desembolso e a previsão de início e fim da execução do objeto, previstos no Plano de Trabalho;
- II) Designar profissional habilitado e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicável, TRT, da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados;
- III) Apresentar ao CONCEDENTE declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Terraço - Castelão  
CEP: 60861-111 | Fortaleza, Ceará, Brasil  
CNPJ: 33.866.288/0001-30  
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

**SOP-CE**  
SUPERINTENDÊNCIA  
DE OBRAS PÚBLICAS



**CEARÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DAS CIDADES



- servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia;
- IV) Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pelo CONCEDENTE ou pelos órgãos de controle;
- V) Exercer, na qualidade de CONCEDENTE, a fiscalização sobre o CTEF – Contrato de Execução e Fornecimento de Obras ou Serviços ou Equipamentos;
- VI) Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;
- VII) Responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;
- VIII) Submeter ao CONCEDENTE quaisquer modificações no Plano de Trabalho que eventualmente sejam necessárias;
- IX) Realizar o pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho durante a vigência deste Instrumento, observado o disposto na Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012, e alterações;
- X) Compatibilizar o objeto deste Convênio com as normas e os procedimentos federais, estaduais e municipais de preservação ambiental, quando for o caso;
- XI) Promover o crédito do recurso financeiro, referente à contrapartida, de acordo com o cronograma de desembolso do Plano de Trabalho e com o disposto na Cláusula Quinta do presente Instrumento;
- XII) Disponibilizar ao cidadão, na rede mundial de computadores ou, na falta desta, em sua sede, informações referentes à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, conforme o disposto na Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012, e alterações, e na Lei Ordinária Estadual nº 15.175, de 28/06/2012;
- XIII) Movimentar os recursos financeiros liberados pelo CONCEDENTE, bem como a contrapartida financeira, exclusivamente, na conta específica vinculada a este Convênio, nos casos de pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante ordem bancária, para aplicação no mercado financeiro ou para ressarcimento de valores;
- XIV) Não utilizar os recursos transferidos pelo CONCEDENTE, inclusive os rendimentos de aplicação no mercado financeiro, bem como os correspondentes a sua contrapartida, em finalidade diversa da estabelecida neste Instrumento, ainda que em caráter de emergência;
- XV) Aplicar os recursos transferidos pelo CONCEDENTE, bem como a contrapartida financeira, em caderneta de poupança ou em fundos de aplicação lastreados em títulos públicos;

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelão  
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil  
CNPJ: 33.866.288/0001-40  
Fone: (35) 3108.2000 / 3108.2001

**SOP-CE**  
SUPERINTENDÊNCIA  
DE OBRAS PÚBLICAS



**CEARA**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DAS CIDADES



- XVI) Promover as licitações para a contratação de obras, serviços e aquisição de materiais de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, bem como demais normas federais e estaduais em vigor, ou apresentar justificativa, com o respectivo embasamento legal, para sua dispensa ou inexigibilidade;
- XVII) Atender, nas contratações e aquisições de bens e serviços necessários à execução deste Convênio, aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 131, de 27/05/2009, na Lei Ordinária Estadual nº 15.175, de 28/06/2012, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias Estadual em vigência;
- XVIII) Utilizar o pregão, preferencialmente na forma eletrônica, na contratação de bens e serviços comuns e, quando não couber, na forma presencial, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto Estadual nº 28.089, de 10/01/2006, devendo a inviabilidade de utilização da forma eletrônica ser devidamente justificada;
- XIX) Inserir cláusula nos contratos celebrados com terceiros, para execução deste Convênio, que permitam o livre acesso dos servidores do CONCEDENTE, bem como dos órgãos de controle interno e externo, aos documentos e registros contábeis das empresas convenentes;
- XX) Restituir ao CONCEDENTE os saldos financeiros remanescentes deste Convênio, inclusive os provenientes de rendimentos de aplicação financeira, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término de sua vigência ou rescisão;
- XXI) Devolver ao CONCEDENTE os valores decorrentes de glosas efetuadas no âmbito do acompanhamento e da fiscalização ou da prestação de contas, quando for o caso;
- XXII) Manter-se adimplente e em situação cadastral regular durante todo o prazo de vigência deste Convênio;
- XXIII) Propiciar, no local da execução do objeto deste Convênio, os meios e as condições necessárias para que o CONCEDENTE possa realizar supervisões;
- XXIV) Assegurar o livre acesso dos servidores do CONCEDENTE, responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização deste Convênio, bem como dos servidores dos Sistemas de Controle Interno e Externo, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos, processos e documentos relacionados, direta ou indiretamente, com o Instrumento pactuado, bem como prestar a estes todas e quaisquer informações solicitadas, quando em missão de acompanhamento, fiscalização ou auditoria;
- XXV) Manter atualizado o registro das informações e dos documentos exigidos pelo Decreto Estadual nº 32.811, de 28/09/2018, e suas alterações;
- XXVI) Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos no local onde forem contabilizados os documentos originais fiscais, trabalhistas e equivalentes, comprobatórios das despesas realizadas com recursos do presente Convênio;





- XXVII) Responsabilizar-se por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente Instrumento;
- XXVIII) Responsabilizar-se por todos os ônus e litígios de natureza trabalhista e previdenciária decorrentes dos recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Convênio;
- XXIX) Apresentar relatórios sobre a execução física financeira deste Convênio, compatíveis com a liberação dos recursos transferidos, assim como informações sobre o andamento da obra ou serviços e a sua conclusão, aos responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização e aos órgãos de controle interno e externo;
- XXX) A prestação de contas deverá ser apresentada ao CONCEDENTE, no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do prazo da vigência do Convênio;
- XXXI) Designar preposto para este Convênio;
- XXXII) Realizar a movimentação dos recursos financeiros liberados pelo Concedente, o que somente poderá ocorrer para atendimento das seguintes finalidades:
- a – Pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho;
  - b – Ressarcimento de valores;
  - c – Aplicação no mercado financeiro.
- XXXIII) Movimentar os recursos da conta específica do Convênio que será efetuada, exclusivamente, por meio de Ordem Bancária de Transferência – OBT, por meio de sistema informatizado próprio;
- XXXIV) A movimentação de recursos prevista no item anterior deverá ser comprovada ao CONCEDENTE mediante a apresentação de extrato bancário da conta específica do instrumento e comprovante de recolhimento dos saldos remanescentes, até 30 (trinta) dias após o término da vigência do convênio ou instrumento congênere.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O prazo de vigência do presente Convênio será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data da assinatura do presente Instrumento.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Havendo atraso na liberação dos recursos previstos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, o prazo deste Instrumento será prorrogado *de ofício*, pelo CONCEDENTE, pelo exato período do atraso verificado, limitado ao prazo estabelecido na Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012, e alterações.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A prorrogação *de ofício* de que trata o parágrafo anterior, será efetivada na vigência deste Instrumento e formalizada por meio de apostilamento, sendo divulgada nas ferramentas de transparência, previstas na Lei Complementar Federal nº 131, de

Av. Alberto Craveiro, 2775 / Terceiro - Castelão  
CEP: 60851-211 (Fortaleza, Ceará, Brasil)  
CNPJ: 33.866.298/0001-50  
Fone: (35) 3108.2800 / 3108.2801

**SOP-CE**  
SUPERINTENDÊNCIA  
DE OBRAS PÚBLICAS



**CEARÁ**  
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DAS CIDADES



27/05/2009, e na Lei Estadual nº 14.306, de 02/03/2009.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O valor total do presente Convênio é de **R\$ 4.202.002,89 (quatro milhões, duzentos e dois mil, dois reais e oitenta e nove centavos)**, correrão à conta do CONCEDENTE e do CONVENENTE, conforme abaixo discriminados:

I) **Recursos do CONCEDENTE: R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)** à conta de dotação aprovada pela Lei Estadual nº 17.860, de 29/12/2021, com a seguinte classificação funcional: **43200007.15.451.341.10083** – Estruturação de Infraestrutura Pública de Convivência; Elemento de Despesa: **444042** – Convênios, Acordos e Ajustes; Região: **12** – Sertão dos Crateús; Fonte: **00** – Recursos Ordinários do Tesouro Estadual. Podendo o respectivo valor sofrer alterações em virtude de possíveis reajustes, realinhamentos de preços e correções por atraso de pagamentos, devidos as Empresas Executoras do(s) Contrato(s) de Obras, objeto do presente Convênio.

II) **Recursos do CONVENENTE: R\$ 202.002,89 (duzentos e dois mil, dois reais e oitenta e nove centavos)** na forma detalhada no Plano de Trabalho, a título de contrapartida, em recursos financeiros.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Os recursos transferidos pelo CONCEDENTE, enquanto não empregados em sua finalidade, bem como a contrapartida, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança ou em fundos de aplicação financeiras lastreadas em títulos públicos.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Os recursos deste Convênio serão mantidos, exclusivamente, na conta específica vinculada a este Instrumento – somente sendo permitida movimentação para o pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante Ordem Bancária de Transferência – OBT, para aplicação no mercado financeiro, na forma do parágrafo primeiro da presente cláusula ou para ressarcimento de valores, devendo ser observado, ainda:

I) os rendimentos das aplicações referidas no parágrafo primeiro desta cláusula serão obrigatoriamente aplicados no objeto do presente Instrumento e estão sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos; e

II) as receitas oriundas dos rendimentos da aplicação dos recursos no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo CONVENENTE.

**PARÁGRAFO QUARTO** – O CONVENENTE deverá comprovar a inclusão em seu orçamento das transferências recebidas do CONCEDENTE, para a execução deste Convênio.

**PARÁGRAFO QUINTO** – O CONVENENTE deverá comprovar a existência em seu orçamento

Av. Alberto Craveiro, 2175 / Térreo - Castelo  
CEP- 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil  
CNPJ: 33.866.288/0001-30  
Fone: (95) 3108.2800 / 3108.2801

**SOP-CE**  
SUPERINTENDÊNCIA  
DE OBRAS PÚBLICAS



**CEARÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DAS CIDADES



dos recursos referentes à contrapartida para complementar a execução do objeto deste Convênio.

**PARÁGRAFO SEXTO** – Os recursos para atender às despesas em exercícios futuros, no caso de investimento, deverão estar consignados no Plano Plurianual do CONVENENTE ou em lei prévia que os autorize.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – CONCEDENTE transferirá os recursos previstos na Cláusula Quinta, em favor do CONVENENTE, em conta bancária específica (**Banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 0747-1, Operação: 006, Conta: 71163-3**) e vinculada ao presente Instrumento, onde serão movimentados, obedecendo ao cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho, referido na Cláusula Segunda, mediante comprovação de adimplência, regularidade e comprovação da contrapartida financeira.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Os recursos previstos na Cláusula Quinta somente serão liberados pelo CONCEDENTE, e a execução iniciada pelo CONVENENTE, após a publicação da íntegra deste Convênio no Portal da Transparência.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – É obrigatória a restituição pelo CONVENENTE ao CONCEDENTE de eventual saldo de recursos, inclusive os provenientes das receitas obtidas com as aplicações financeiras realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término da vigência ou da rescisão do presente Instrumento.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A não devolução dos saldos financeiros remanescentes implicará a inadimplência do CONVENENTE e a instauração de Tomada de Contas Especial.

**PARÁGRAFO QUARTO** – O CONVENENTE deverá, ainda, restituir ao CONCEDENTE o valor transferido, corrigido monetariamente desde a data do recebimento, pelo índice oficial aplicado à caderneta de poupança ou aos fundos de aplicação financeira, lastreados em títulos públicos, conforme regulamento, nas seguintes hipóteses:

- I) quando o objeto conveniado não for executado;
- II) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio.

**PARÁGRAFO QUINTO** – Os valores decorrentes de glosas efetuadas no âmbito do



acompanhamento e da fiscalização ou da prestação de contas deverão ser ressarcidos, pelo **CONVENIENTE** ao **CONCEDENTE**, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação enviada pelo responsável pelo acompanhamento deste Convênio, sob pena de rescisão do Instrumento, inadimplência e instauração de Tomada de Contas Especial.

#### **CLÁUSULA OITAVA- DA AÇÃO PROMOCIONAL**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente Convênio será, obrigatoriamente, destacada a participação do **CONCEDENTE**, observado o disposto no parágrafo 1º, do artigo 37, da Constituição Federal.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Inclui-se nessa obrigação matéria jornalística destinada à divulgação em qualquer veículo de comunicação social, convites, folhetos e impressos em geral, tanto para circulação interna como externa.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O **CONCEDENTE** estará autorizado a reproduzir o conteúdo do material produzido, indicadas as fontes e os respectivos créditos.

**PARÁGRAFO QUARTO** – O **CONVENIENTE** deverá afixar e se responsabilizar pela conservação, até o final da vigência do instrumento, no local da obra ou serviço, placa informativa contendo:

- I) valor da obra ou serviço;
- II) prazo de duração;
- III) empresa que executa a obra ou serviço;
- IV) dizeres de que a obra é custeada em parceria com o Governo do Estado do Ceará;
- V) indicação do órgão ou entidade que celebrou o Convênio.

**PARÁGRAFO QUINTO** – No caso de compras, o **CONVENIENTE** deverá afixar no bem adquirido, quando possível, os dizeres de que a aquisição é custeada em parceria com o Governo do Estado do Ceará, bem como a indicação do órgão ou entidade que celebrou o Convênio.

#### **CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Este Convênio poderá ser alterado por meio de termo aditivo ou apostilamento, durante sua vigência, vedada a alteração do objeto pactuado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – As alterações de que trata o parágrafo anterior deverão ser formalizadas por meio de Termo Aditivo, por meio de autorização ou proposição pelo **CONCEDENTE**, através de solicitação fundamentada do **CONVENIENTE** ou sua anuência conforme o disposto no art. 35 na Lei Complementar Estadual nº 119/2012 e alterações,





assegurada a publicidade nas ferramentas de transparência e no Diário Oficial do Estado, conforme a referida Lei.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Para celebrar aditivo de valor, o CONVENIENTE deverá estar adimplente e com a situação cadastral regular.

**PARÁGRAFO QUARTO** – Independentemente de anuência do CONVENIENTE, deverão ser feitas por meio de apostilamento as seguintes alterações:

- I) Prorrogação de Ofício;
- II) Classificação orçamentária;
- III) Redesignação de Gestor e/ou Fiscal do Instrumento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A execução deste Convênio será acompanhada e fiscalizada pelo CONCEDENTE, de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a adequada execução do objeto, sem prejuízo da competência dos órgãos de controle interno e externo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Os responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização poderão, a qualquer momento, solicitar esclarecimentos acerca de quaisquer indícios de irregularidade na aplicação dos recursos transferidos ou sobre outras pendências de ordem financeira, técnica ou legal relacionadas a este Convênio.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Fica designada a **GESTORA**, Sra. **JOVANKA RANGEL FROTA**, **MATRÍCULA Nº 700191-4**, **CPF Nº 317.348.393-68**, como representante do CONCEDENTE, responsável pelo acompanhamento deste Convênio, o qual avaliará os produtos e os resultados da parceria, verificará a regularidade no pagamento das despesas e na aplicação das parcelas de recursos, registrará todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto pactuado, inclusive as apontadas pela fiscalização, e adotará as medidas necessárias ao saneamento das falhas observadas, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

**PARÁGRAFO QUARTO** – O acompanhamento deste Convênio será realizado com base no Plano de Trabalho e respectivos cronogramas de execução do objeto e de desembolso de recursos.

**PARÁGRAFO QUINTO** – Diante de quaisquer irregularidades na execução deste Convênio, resultantes do uso inadequado dos recursos transferidos ou de pendências de ordem técnica, o responsável pelo acompanhamento suspenderá a liberação dos recursos e o pagamento das despesas relativas ao presente Instrumento e notificará o CONVENIENTE para que adote medidas



Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelo  
CEP: 60861-711 | Fortaleza, Ceará, Brasil  
CNPJ: 33.866.288/0001-00  
Fone: (85) 3108.2700 / 3108.2801

**SOP-CE**  
SUPERINTENDÊNCIA  
DE OBRAS PÚBLICAS



**CEARA**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DAS CIDADES



saneadoras em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação, podendo prorrogar este prazo por igual período.

**PARÁGRAFO SEXTO** – Não havendo o saneamento da(s) pendência(s), no prazo fixado no parágrafo anterior, o responsável pelo acompanhamento deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, adotar as medidas previstas na Lei Complementar Estadual nº 119/2012 e suas alterações.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** – O não atendimento, pelo CONVENIENTE, ao disposto no parágrafo anterior acarretará a rescisão deste Convênio, a sua inadimplência e a instauração de Tomada de Contas Especial.

**PARÁGRAFO OITAVO** – O responsável pelo acompanhamento registrará a inadimplência do CONVENIENTE, se:

- 1) os saldos financeiros remanescentes não forem devolvidos no prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência ou da rescisão deste Instrumento;
- 2) a prestação de contas não for apresentada conforme cláusula 2ª, II, 24, deste Instrumento;
- 3) a prestação de contas avaliada como irregular;
- 4) o instrumento tiver sido rescindido, na hipótese de não ter efetuado o ressarcimento do valor glosado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012, e alterações.

**PARÁGRAFO NONO** – A FISCALIZAÇÃO da execução do objeto deste Instrumento será realizada pelo(a) Engenheiro(a) **DIEGO DEMÉTRIO TORRES, MATRÍCULA Nº 300001990**, CPF Nº 913.252.262-20, sendo permitida a contratação de terceiros ou a celebração de parcerias com outros órgãos, para assisti-lo(a) ou subsidiá-lo(a) de informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do art. 93 do Decreto Estadual nº 32.811, de 28/09/2018, e alterações.

**PARÁGRAFO DÉCIMO** – Ao responsável pela fiscalização caberá visitar o local da execução do objeto pactuado, atestar a sua execução e comunicar, ao responsável pelo acompanhamento, quaisquer irregularidades detectadas, sem prejuízo de outras ações que se façam necessárias.

**PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO** – O CONCEDENTE proverá as condições necessárias à realização das atividades de acompanhamento e fiscalização deste Convênio, programando visitas e outras diligências ao local da execução do objeto com tal finalidade que, caso não ocorram, deverão ser devidamente justificadas.

**PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO** – O CONVENIENTE garantirá o livre acesso aos servidores

Av. Alberto Craveiro, 2.775 / Térreo - Castelão  
CEP: 60661-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil  
CNPJ: 33.866.288/0001-30  
Fone: (85) 3108.2900 / 3108.2801

**SOP-CE**  
SUPERINTENDÊNCIA  
DE OBRAS PÚBLICAS



**CEARA**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DAS CIDADES



do CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e externo, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o presente Convênio, não podendo sonegar, a estes servidores, quando investidos na missão de acompanhamento, fiscalização ou auditoria, processos, documentos e informações relativos à parceria, sob pena de irregularidade cadastral.

**PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO** – Os agentes designados para o acompanhamento e para a fiscalização deste Instrumento são responsáveis pelos atos ilícitos que praticarem, respondendo, para todos os efeitos, pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo.

**PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO** – O CONVENIENTE ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal, se, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização e aos órgãos de controle interno e externo, no desempenho de suas funções institucionais relativas a este Convênio.

**PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO** – Fica facultado ao CONCEDENTE, por meio do Fiscal ou do Gestor do Convênio, requerer, solicitar ou requisitar documentos, diligências, vistorias ou quaisquer outras medidas que considerem necessárias à comprovação da realização do objeto ou da correta aplicação dos recursos transferidos, não ficando adstrito à redação deste instrumento, mas à Lei, Decretos e princípios do Direito Administrativo.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VEDAÇÃO DE DESPESAS**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – É vedada, conforme art. 25, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, a utilização dos recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento, ainda que em caráter de emergência e com posterior cobertura, e para pagamento de despesas com:

- I) taxa de administração, de gerência ou similar, salvo as situações específicas previstas em regulamento;
- II) remuneração, a qualquer título, a servidor ou empregado público ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o segundo grau, por serviços de consultoria, assistência técnica, gratificação ou qualquer espécie de remuneração adicional, ressalva das hipóteses previstas na Lei Complementar nº 119/2012 e alterações, em lei específica e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III) multas, juros ou correção monetária, referente a pagamentos e recolhimentos fora dos prazos, exceto quando decorrer de atraso na liberação de recursos financeiros, motivado exclusivamente pelo órgão ou entidade CONCEDENTE;
- IV) clubes, associações ou quaisquer entidades congêneres, cujos dirigentes ou controladores





Av. Alberto Cavalcanti, 2775 / Térreo - Castiello  
CEP. 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil  
CNPJ. 33.866.288/0001-30  
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

**SOP-CE**  
SUPERINTENDÊNCIA  
DE OBRAS PÚBLICAS



**CEARÁ**  
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DAS CIDADES



sejam agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do gestor do órgão responsável pela celebração deste Instrumento;

V) publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, relacionadas com o objeto deste Instrumento, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal das autoridades e servidores do CONCEDENTE e do CONVENENTE;

VI) bens e serviços fornecidos pelo CONVENENTE, seus dirigentes ou responsáveis, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – É vedado qualquer tipo de pagamento em desacordo com o disposto na Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012, e alterações.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – É vedada a aplicação dos recursos transferidos e da contrapartida, no mercado financeiro, em desacordo com os critérios previstos no parágrafo terceiro da cláusula quinta.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O CONVENENTE apresentará ao CONCEDENTE prestação de contas comprovando a boa e regular aplicação dos recursos transferidos por meio deste Convênio, no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento da vigência do Convênio, sob pena de inadimplência e instauração de Tomada de Contas Especial, na forma do regulamento.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A Prestação de Contas observará as normas contidas no Decreto Estadual nº 32.811, de 28/09/2018, contendo elementos que permitam ao gestor do instrumento concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, bem como mediante os seguintes procedimentos:

- I) Apresentação do Relatório Final de Execução do Objeto;
- II) Devolução do saldo remanescente, quando houver;
- III) Apresentação do extrato da movimentação bancária da conta específica compreendendo o período de vigência do presente Instrumento.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O CONCEDENTE analisará a prestação de contas no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação pelo CONVENENTE, sob pena de ficar proibido de celebrar novos Termos de Ajuste ou instrumentos congêneres.







**PARÁGRAFO QUARTO** – Por ocasião da prestação de contas, o CONCEDENTE emitirá parecer nos termos dos artigos 102 e 103, do Decreto nº 32.811, de 01/10/2018.

**PARÁGRAFO QUINTO** – A reprovação pelo CONCEDENTE da prestação de contas apresentada pelo CONVENIENTE ensejará a sua inadimplência e a instauração de Tomada de Contas Especial.

**PARÁGRAFO SEXTO** – As despesas relativas à consecução do objeto pactuado neste Instrumento deverão ser comprovadas mediante documentos fiscais originais emitidos em nome do CONVENIENTE, devidamente identificados com o número deste Convênio.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** – O CONVENIENTE deve manter arquivo, em boa ordem, com os documentos originais que comprovem a execução e a boa e regular aplicação dos recursos recebidos por meio de este Convênio, os quais permanecerão à disposição do CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da apresentação da prestação de contas, se tiver sido aprovada, ou da data de regularização da prestação de contas inicialmente reprovada.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Este Convênio poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nos seguintes casos:

- I) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, devendo ser formalmente justificada pela autoridade competente;
- II) Determinada pelo Concedente, por meio de ato unilateral, desde que formalmente motivada nos autos do processo, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa, podendo se dar nas seguintes situações:
  - a) descumprimento de qualquer das cláusulas deste instrumento ou das condições estabelecidas no plano de trabalho anexo;
  - b) não utilização dos recursos financeiros até o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da primeira liberação de recursos, paralisação ou atraso do cronograma de execução, injustificados;
  - c) descumprimento da legislação vigente;
  - d) não saneamento de irregularidades na execução deste instrumento, decorrentes do uso inadequado dos recursos e pendências de ordem técnica;
  - e) constatação, a qualquer tempo, de falsidade na documentação apresentada;
  - f) a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial;



- g) o desatendimento das determinações do servidor designado para acompanhar e fiscalizar o instrumento congênere, assim como as de seus superiores;
  - h) a dissolução, alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura do CONVENENTE, que prejudique a execução do instrumento;
  - i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo CONCEDENTE e exaradas no processo administrativo a que se refere este instrumento;
  - j) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste instrumento.
- III) Em decorrência de determinação judicial.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A rescisão deste Convênio implica a antecipação do final da sua vigência, trazendo as seguintes consequências para os atos, registros e controles a ele vinculados:

- I) alteração nos prazos relativos ao período de execução do objeto;
- II) interrupção do Cronograma de Desembolso;
- III) interrupção da emissão de OBT, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 87 do Decreto nº 32.811, de 28/09/2018;
- IV) interrupção do cronograma de Metas/Etapas de execução do objeto;
- V) interrupção do cronograma de monitoramento deste instrumento;
- VI) início da contagem dos prazos para apresentação e análise da Prestação de Contas, nos termos do Capítulo I do Título IX do Decreto nº 32.811, de 28/09/2018.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O não ressarcimento, pelo CONVENENTE, dos valores glosados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação enviada pelo responsável pelo acompanhamento, ensejará sua inadimplência, a rescisão deste Instrumento e a instauração de Tomada de Contas Especial.

**PARÁGRAFO QUARTO** – A rescisão, por acordo entre os partícipes, ou unilateralmente pelo Concedente, será formalizada por meio da celebração de Termo de Rescisão, que terá eficácia com a publicação de seu extrato, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, no Diário Oficial do Estado e no Portal da Transparência ou nos termos da decisão judicial que a determinou.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DÚVIDAS E DOS CASOS OMISSOS**

**PARÁGRAFO ÚNICO** – As dúvidas suscitadas na execução deste Convênio, bem como os casos



Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Castelo  
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceará, Brasil  
CNPJ: 33.866.298/0001-00  
Fone: (85) 3108.2800 / 3108.2801

**SOP-CE**  
SUPERINTENDÊNCIA  
DE OBRAS PÚBLICAS



**CEARÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DAS CIDADES



**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO**

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Fica eleito o foro da cidade de Fortaleza-CE com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir os conflitos decorrentes deste Convênio, que não forem resolvidos administrativamente.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e formam, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Fortaleza-CE, 11 de maio de 2022.

  
**FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO**  
SUPERINTENDENTE DA SOP

  
**JESUINO RODRIGUES DE SAMPAIO NETO**  
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE-CE

**TESTEMUNHAS:**

1. Jago César R. CPF: 080.890.533 63
2. Francisco Antônio Costa CPF: 156.347.023 41



PREFEITURA DE  
**NOVO ORIENTE**



**PLANO DE TRABALHO**

**Nº MAPP**

1852

**Concedente:**

Superintendencia de Obras Públicas (SOP)

**I - IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO**

**Proponente/Conveniente**

**Nome:**

Prefeitura Municipal de Novo Oriente

**CNPJ:**

07.982.010/0001 - 19

**Responsável**

**Nome:**

Jesuino Rodrigues de Sampaio Neto

**CPF:**

778.018.573 - 72

**II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

**Valor:**

R\$

4.202.002,89

**Data do Plano de Trabalho:**

11/04/2022

**III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO**

**Objeto:**

Obra do canal de desvio das águas no Município de Novo Oriente-CE

**Público Alvo:**

População do Município de Novo Oriente - CE, com cerca de 28.737 (IBGE 2020).

**IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO**

**Início:**

APDA

**Fim:**

APDA + 12 MESES

**V - JUSTIFICATIVA**

O Município de Novo Oriente - CE com população estimada de 28.737 habitantes (IBGE 2020) têm expandido sua densidade demográfica e sua infraestrutura municipal nos últimos anos. Desta forma, essa obra pretende suprir limitações de deficiências relacionadas à infraestrutura do Município, implicando assim, na devida mobilidade e trafegabilidade de sua população.

**VI - INDICADORES PARA AFERIÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS**

Fiscalizar periodicamente, conforme contrato, a execução do objeto, por meio de profissional habilitado;  
Realizar relatórios de acompanhamento de execução física da obra e inserir no sistema E-Parcerias;  
Realizar prestação de contas final, com a expedição do termo de encerramento do objeto e inserir no sistema E-Parcerias, a ser validado pelo Concedente.

Prefeitura de Novo Oriente. Rua Deocleciano Aragão, 15 - Centro. CEP 63.740-000. Ceará. CNPJ:  
07.982.010/0001-19

Jesuino Rodrigues de Sampaio Neto  
Prefeito Municipal

| VII - METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO                                    |  |                  |            |                |                |                     |                                  |
|---|--|------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------------|
| META 1  |  | INDICADOR FÍSICO |            | VALOR TOTAL    |                | PERÍODO             |                                  |
|   |  | UNIDADE          | QUANTIDADE |                |                | DATA INICIAL        | DATA FINAL                       |
| Obra do canal de desvio das águas no Município de Novo Oriente-CE |  | UNIDADE          | 1,00       | R\$            | 4 202 002,89   | APDA                | APDA - 12 MESES                  |
| ETAPA 1   |  | UNIDADE          | QUANTIDADE |                | VALOR TOTAL    | DATA INICIAL        | DATA FINAL                       |
| Obra do canal de desvio das águas no Município de Novo Oriente-CE |  | UNIDADE          | 1,00       | R\$            | 4 202 002,89   | APDA                | APDA - 12 MESES                  |
| GASTOS PREVISTOS NA ETAPA   |  |                  |            |                |                |                     |                                  |
| ITEM  | DESCRIÇÃO  | UNIDADE          | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | NATUREZA DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA |
| 1.1   | SERVIÇOS PRELIMINARES  |                  |            |                | R\$ 153.543,65 |                     |                                  |
| <b>CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO</b>                                     |  |                  |            |                |                |                     |                                  |
| 1.1.1   | PLACAS PARA A OBRA   | M2               | 10,00      | R\$ 196,70     | R\$ 1.967,00   | 44.90.51.00         | Obras e instalações              |
| 1.1.2   | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAVALO MECÂNICO O PRANCHA DE 3 EIXOS   | KM               | 789,00     | R\$ 4,74       | R\$ 3.743,65   | 44.90.51.00         | Obras e instalações              |
| 1.1.3   | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO PRANCHA DE 3 EIXOS | KM               | 789,00     | R\$ 4,74       | R\$ 3.743,65   | 44.90.51.00         | Obras e instalações              |
| 1.1.4   | INSTALAÇÃO DE PRONCHAS DE ÁGUA                                       | UND              | 1,00       | R\$ 1.302,74   | R\$ 1.302,74   | 44.90.51.00         | Obras e instalações              |
| 1.1.5   | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA TELEFONE E LOCAÇÃO             | UND              | 1,00       | R\$ 1.699,35   | R\$ 1.699,35   | 44.90.51.00         | Obras e instalações              |
| 1.1.6   | BARRACÃO ABERTO  | M2               | 70,00      | R\$ 154,33     | R\$ 10.803,10  | 44.90.51.00         | Obras e instalações              |
| <b>1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>                                  |  |                  |            |                |                |                     |                                  |
| 1.2.1   | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  | %                | 100,00     | R\$ 1.302,85   | R\$ 130.285,00 | 44.90.51.00         | Obras e instalações              |
| <b>INFRA-ESTRUTURA DO CANAL</b>                                   |  |                  |            |                |                |                     |                                  |
| <b>PREPARAÇÃO DO TERRENO</b>                                      |  |                  |            |                |                |                     |                                  |
| 1.2.2   | GRADAGEM E LIMPEZA DO TERRENO  | M2               | 9.063,68   | R\$ 5,05       | R\$ 45.721,08  | 44.90.51.00         | Obras e instalações              |
| 1.2.3   | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE                     | M3               | 2.716,11   | R\$ 4,18       | R\$ 11.353,34  | 44.90.51.00         | Obras e instalações              |
| 1.2.4   | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM             | M3               | 2.716,11   | R\$ 6,24       | R\$ 16.948,63  | 44.90.51.00         | Obras e instalações              |
| 1.2.5   | ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA                           | M3               | 2.716,11   | R\$ 1,90       | R\$ 5.299,41   | 44.90.51.00         | Obras e instalações              |
| <b>LOCAÇÃO</b>  |  |                  |            |                |                |                     |                                  |
| 1.2.6   | LOCAÇÃO E ENVILAMENTO DE REDE DE LULA E DE VISSARIGENERALDEM         | M                | 781,45     | R\$ 2,70       | R\$ 2.116,83   | 44.90.51.00         | Obras e instalações              |
| <b>TRÂNSITO E SEGURANÇA E TRAVESSIA</b>                           |  |                  |            |                |                |                     |                                  |
| 1.2.7   | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARRERAS                                 | M                | 1.400,00   | R\$ 6,65       | R\$ 9.310,00   | 44.90.51.00         | Obras e instalações              |
| 1.2.8   | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA   | UN               | 20,00      | R\$ 16,58      | R\$ 331,60     | 44.90.51.00         | Obras e instalações              |
| <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>   |  |                  |            |                |                |                     |                                  |
| 1.2.9   | ESCOVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 20T          | M3               | 42.824,62  | R\$ 3,10       | R\$ 132.756,32 | 44.90.51.00         | Obras e instalações              |
| 1.2.10  | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE                     | M3               | 11.849,53  | R\$ 4,15       | R\$ 49.194,04  | 44.90.51.00         | Obras e instalações              |
| 1.2.11  | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM              | M3               | 11.849,53  | R\$ 6,24       | R\$ 73.941,07  | 44.90.51.00         | Obras e instalações              |
| 1.2.12  | ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA                           | M3               | 11.849,53  | R\$ 1,95       | R\$ 23.106,68  | 44.90.51.00         | Obras e instalações              |



|                                   |  |         |              |            |                  |              |             |                     |  |
|-----------------------------------|--|---------|--------------|------------|------------------|--------------|-------------|---------------------|--|
| 1.2.13                            | RECONFORMAÇÃO PATROLAGEM DA PLATAFORMA   | M2      | R\$ 7.932,20 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00         | R\$ 7.932,20 | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| 1.2.14                            | REGULARIZAÇÃO DE TALUDES   | M2      | R\$ 3.349,69 | R\$ 0,30   | R\$ 1.004,87     | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| <b>ESGOTAMENTO</b>                |  |         |              |            |                  |              |             |                     |  |
| 1.2.15                            | ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 3.000 W 120V/1φ   | H       | R\$ 20,00    | R\$ 6,50   | R\$ 130,00       | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| 1.2.16                            | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM ÁREAS   | PTx/DIA | R\$ 3,00     | R\$ 24,20  | R\$ 72,59        | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| <b>ALVENARIA DE PEDRA / CANAL</b> |  |         |              |            |                  |              |             |                     |  |
| 1.2.17                            | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) / AGREGADOS ADQUIRIDOS  | M3      | R\$ 4.291,91 | R\$ 673,63 | R\$ 2.401.452,87 | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| 1.2.18                            | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X  | M2      | R\$ 3.349,89 | R\$ 124,59 | R\$ 417.362,80   | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| 1.2.19                            | REGULARIZAÇÃO DE BASE DE ARGAMASSA CIMENTO E ÁREAS / PENERAR (TRAÇO 1:3 - ESP=3cm)   | M2      | R\$ 5.261,42 | R\$ 27,42  | R\$ 144.266,14   | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| 1.2.20                            | JUNTA ASFALTICA NAS PLACAS DOS TALUDES DAS LADOGAS (SELADA 1:1,0x 3,0cm)   | M       | R\$ 997,42   | R\$ 11,98  | R\$ 10.870,80    | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| <b>SERVICOS AUXILIARES</b>        |  |         |              |            |                  |              |             |                     |  |
| 1.2.21                            | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M3      | R\$ 94,81    | R\$ 137,08 | R\$ 8.048,79     | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| 1.2.22                            | BARBACA DE TUBO PVC ESGOTO 30mm INCLUSIVE GEOTEXIL NA ORECIDO 100% POLIESTER COM RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL MINIMA DE 8KN/m (BOMNT.08 OU SIMILAR) E BRITA | UH      | R\$ 76,90    | R\$ 6,53   | R\$ 486,26       | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| 1.2.23                            | FUNDEAMENTO PARA JUNTA DE OBLATAÇÃO 0,22 ATÉ 30CM  | M       | R\$ 790,51   | R\$ 136,38 | R\$ 40.241,29    | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| 1.2.24                            | JUNTA DE OBLATAÇÃO = BASE DO MASTIQUE (1,05x1,00cm)  | M       | R\$ 280,81   | R\$ 51,17  | R\$ 14.619,02    | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| 1.2.25                            | CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E REGULADO JUNCTION REITO ARMADO (2,25 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FABRIL                        | M       | R\$ 1.481,27 | R\$ 72,55  | R\$ 107.910,57   | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| <b>CHEGADA D'ÁGUA</b>             |  |         |              |            |                  |              |             |                     |  |
| 1.2.26                            | CONCRETO FIMBR. FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO  | M3      | R\$ 13,74    | R\$ 583,33 | R\$ 3.186,40     | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| 1.2.27                            | ARMADURA CA-50A MEDIA D= 8 ou 10,0MM   | KG      | R\$ 591,60   | R\$ 16,35  | R\$ 10.355,05    | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| 1.3                               | <b>OBRA DE ARTES CORRENTE</b>  |         |              |            | R\$ 240.000,00   |              |             |                     |  |
| <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>         |  |         |              |            |                  |              |             |                     |  |
| 1.3.1                             | ESCOVAÇÃO E REMOVER CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO RÓDIA ATÉ 2M  | M3      | R\$ 29,04    | R\$ 3,10   | R\$ 309,50       | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| <b>ALVENARIA</b>                  |  |         |              |            |                  |              |             |                     |  |
| 1.3.2                             | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) / AGREGADOS ADQUIRIDOS  | M3      | R\$ 149,14   | R\$ 673,63 | R\$ 86.664,18    | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| 1.3.3                             | CONCRETO FIMBR. FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO  | M3      | R\$ 69,74    | R\$ 593,63 | R\$ 35.467,48    | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| 1.3.4                             | ESCORIMENTO DE OBRAS DE ARTES CORRENTE S   | M2      | R\$ 268,46   | R\$ 75,87  | R\$ 20.398,06    | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| 1.3.5                             | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X  | M2      | R\$ 315,86   | R\$ 124,59 | R\$ 39.318,11    | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| 1.3.6                             | BALIZADOR EM PVC RIGIDO DE 30CM E MOVIMENTO DE CONCRETOS   | UH      | R\$ 29,00    | R\$ 216,44 | R\$ 4.388,80     | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| <b>FERRAGEM</b>                   |  |         |              |            |                  |              |             |                     |  |
| 1.3.7                             | ARMADURA CA-50A FINA D= 4,0 A 6,40MM   | KG      | R\$ 301,54   | R\$ 16,04  | R\$ 14.467,12    | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| 1.3.8                             | ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,5 A 10,0MM  | KG      | R\$ 2.066,74 | R\$ 18,35  | R\$ 45.938,59    | 44.90.51.00  | 44.90.51.00 | Obras e Instalações |  |
| 1.4                               | <b>INDUMENTAÇÃO</b>  |         |              |            | R\$ 298.000,00   |              |             |                     |  |
| <b>SERVICOS PRELIMINARES</b>      |  |         |              |            |                  |              |             |                     |  |



|   |  |    |              |            |                |                     |                     |
|---|--|----|--------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1.4.1   | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)                     | M2 | R\$ 4.481,48 | R\$ 0,34   | R\$ 1.513,50   | 44.90.51.00         | Obras e Instalações |
| <b>PAVIMENTAÇÃO DE BUA</b>  |  |    |              |            |                |                     |                     |
| 1.4.2   | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO   | M2 | R\$ 4.481,48 | R\$ 2,77   | R\$ 12.320,89  | 44.90.51.00         | Obras e Instalações |
| 1.4.3   | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N.   | M3 | R\$ 880,30   | R\$ 4,78   | R\$ 4.255,83   | 44.90.51.00         | Obras e Instalações |
| 1.4.4   | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA FOSCA BI-RELEVAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)                | M2 | R\$ 3.137,23 | R\$ 47,81  | R\$ 149.263,52 | 44.90.51.00         | Obras e Instalações |
| <b>OBRAS DE DRENAGEM</b>  |  |    |              |            |                |                     |                     |
| 1.4.5   | BANQUETA MECÂNICO DE CONCRETO MOLHADO NO LOCAL                                 | M  | R\$ 858,40   | R\$ 30,92  | R\$ 26.541,73  | 44.90.51.00         | Obras e Instalações |
| 1.4.6   | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M                                  | M3 | R\$ 28,44    | R\$ 58,18  | R\$ 1.505,54   | 44.90.51.00         | Obras e Instalações |
| 1.4.7   | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL   | M3 | R\$ 25,44    | R\$ 525,84 | R\$ 13.377,37  | 44.90.51.00         | Obras e Instalações |
| <b>PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS</b>   |  |    |              |            |                |                     |                     |
| 1.4.8   | BANQUETA MECÂNICO DE CONCRETO MOLHADO NO LOCAL                                 | M  | R\$ 423,95   | R\$ 30,92  | R\$ 13.108,53  | 44.90.51.00         | Obras e Instalações |
| 1.4.9   | ATERRO DE COMPACTAÇÃO MECÂNICA CONTRA E MAL DE AQUISIÇÃO                       | M3 | R\$ 84,70    | R\$ 118,25 | R\$ 9.855,94   | 44.90.51.00         | Obras e Instalações |
| 1.4.10  | LASTRO DE PISO DE PEDRA  | M3 | R\$ 74,82    | R\$ 116,57 | R\$ 1.698,45   | 44.90.51.00         | Obras e Instalações |
| 1.4.11  | PISO INTERTRAVADO TIPO TJOJINHO (20 X 10 X 4 CM) C/RETA COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | R\$ 932,89   | R\$ 53,04  | R\$ 49.469,88  | 44.90.51.00         | Obras e Instalações |
| <b>LIMPEZA DA OBRA</b>  |  |    |              |            |                |                     |                     |
| 1.4.12  | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA   | M2 | R\$ 4.481,48 | R\$ 1,52   | R\$ 6.788,25   | 44.90.51.00         | Obras e Instalações |
| <b>VALOR DA META</b>  |  |    |              |            | <b>R\$</b>     | <b>4.202.002,89</b> |                     |
| <b>VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO</b>  |  |    |              |            | <b>R\$</b>     | <b>4.202.002,89</b> |                     |
| Prefeitura de Novo Oriente, Rua Decosteliano Aragão, 15 - Centro - CEP 63.740-000 - Ceará. CNPJ: 07.962.010/0001-18 |  |    |              |            |                |                     |                     |

  
 Jesuilo Rodrigues de Sampaio Neto

Prefeito Municipal



| Valores: |  | Descrição              | %       | Valores (R\$) |              |
|----------|--|------------------------|---------|---------------|--------------|
|          |  | Valor Total:           | 100,00% | R\$           | 4.202.002,89 |
|          |  | Valor do Repasse       | 95,19%  | R\$           | 4.000.000,00 |
|          |  | Valor da Contrapartida | 4,81%   | R\$           | 202.002,89   |

| IX - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |                         |              |              |              |                         |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| REPASSE                       | Meta 1                  | Meta 2       | Meta 3       | Meta 4       | SOMA                    |
| APDA                          | R\$ 1.800.000,00        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ 1.800.000,00        |
| APDA + 2 MESES                | R\$ 1.200.000,00        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ 1.200.000,00        |
| APDA + 3 MESES                | R\$ 1.000.000,00        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ 1.000.000,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>               | <b>R\$ 4.000.000,00</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 4.000.000,00</b> |
| CONTRÁ PARTIDA FINANCEIRA     | Meta 1                  | Meta 2       | Meta 3       | Meta 4       | SOMA                    |
| APDA                          | R\$ 90.901,29           | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ 90.901,29           |
| APDA + 2 MESES                | R\$ 60.600,87           | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ 60.600,87           |
| APDA + 3 MESES                | R\$ 50.500,73           | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        | R\$ 50.500,73           |
| <b>SUBTOTAL</b>               | <b>R\$ 202.002,89</b>   | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 202.002,89</b>   |

|  |   |
|--|---|
| ASSINATURA DO PROPONENTE<br>Novo Oriente - CE <u>11, 04, 22</u><br><br>Jesuino Rodrigues de Sampaio Neto<br>Prefeito Municipal | APROVAÇÃO DO CONCEDENTE<br>Fortaleza - CE <u>11, 05, 2022</u><br><br>Francisco Quatino Vieira Neto<br>Superintendência de Obras Públicas<br>Superintendente |
|--|---|

Prefeitura de Novo Oriente - Rua Deoclécio Aragão, 15 - Centro - CEP 63.740-000 - Ceará. CNPJ 07.982.010/0001-19





PREFEITURA DE  
**NOVO ORIENTE**



**ANEXO II**

**CONCORRÊNCIA – EDITAL Nº 05.014/2022**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,  
COMPOSIÇÃO BDI**



PREFEITURA DE  
**NOVO ORIENTE**



**ANEXO III**

**CONCORRÊNCIA – EDITAL Nº 05.014/2022**

**MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO**

**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE/CE**  
**Ref.: CONCORRÊNCIA – EDITAL Nº 05.014/2022**

A empresa ....., inscrita no CNPJ nº ..... e  
Inscrição Municipal nº ....., sediada à  
....., bairro....., Cidade de  
....., Estado ....., por intermédio de seu representante  
legal, o Sr. ...., portador da Cédula de Identidade nº  
....., apresenta neste processo licitatório na  
qualidade de Credenciado(a), o(a) Sr.(a) ....., portador da  
Cédula de Identidade nº ....., e inscrito(a) do CPF nº  
....., conferindo-lhe todos os poderes necessários à  
prática de quaisquer atos relacionados ao Edital CONCORRÊNCIA –  
EDITAL Nº 05.014/2022, assim como os poderes específicos para assinar  
e rubricar as propostas, apresentar reclamações, impugnações ou  
recursos, assinar atas e o poder de renunciar ao direito de interposição de  
recurso.

Local e Data

Assinatura e Qualificação do Representante Legal

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da  
empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou  
procurador devidamente habilitado.



PREFEITURA DE  
**NOVO ORIENTE**



**ANEXO IV**

**CONCORRÊNCIA – EDITAL Nº 05.014/2022**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR E  
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO**

**REF.: CONCORRÊNCIA – EDITAL Nº 05.014/2022**

Prezados Senhores,

Pela presente declaramos, para todos os fins de direito, e sob as penalidades cabíveis que a empresa ..... inscrita no CNPJ nº ..... não está incurso nas penalidades dos artigos 87, III e IV da Lei nº 8.666/93 e, por isto, não tem impedimento para licitar nem contratar com o Município de Novo Oriente.

Local e Data

Assinatura e Qualificação do Representante Legal

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado.



**ANEXO V**

**CONCORRÊNCIA – EDITAL Nº 05.014/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE/CE**

**MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA**

**Ref.: CONCORRÊNCIA – EDITAL Nº 05.014/2022**

A empresa ....., inscrita no CNPJ nº ....., inscrição Municipal nº ....., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ....., portador da Cédula de Identidade nº ..... e inscrito no CPF nº ....., **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Local e Data

Assinatura e Qualificação do Representante Legal

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado.



**ANEXO VI**  
**CONCORRÊNCIA – EDITAL Nº 05.014/2022**

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa ....., inscrita no CNPJ nº .....,  
inscrição Municipal nº ....., por intermédio de seu  
representante legal, o(a) Sr.(a) ....., portador da Cédula  
de Identidade nº ..... e inscrito no CPF nº .....,  
DECLARA, para fins do disposto no subitem nº \_\_\_\_\_ deste Edital de  
**CONCORRÊNCIA – EDITAL Nº 05.014/2022**, sob as penas da lei, que  
esta empresa, na presente data, é considerada:

MICROEMPRESA, conforme o inciso I do artigo 3º da Lei Complementar  
Federal nº123, de 14 de dezembro de 2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei  
Complementar Federal nº123, de 14 de dezembro de 2006.

Declara ainda que a empresa não se enquadra em nenhuma das hipóteses  
descritas no §4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº123, de 14 de  
dezembro de 2006.

Local e Data

Assinatura e Qualificação do Representante Legal

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da  
empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou  
procurador devidamente habilitado.



**ANEXO VII**

**CONCORRÊNCIA – EDITAL Nº 05.014/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE**

**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

Prezados Senhores,

Apresentamos a presente proposta para o objeto solicitado, e declaramos que:

- O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;
- Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da aquisição;
- O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias;
- Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da compra.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE. | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|------|---------------|-------|-------|-----------|-----------|
|      |               |       |       |           |           |
|      |               |       |       |           |           |
|      |               |       |       |           |           |

**RAZÃO SOCIAL:**

**ENDEREÇO:**

**CNPJ/MF Nº:**

**TELEFONE:**

**ENDEREÇO ELETRÔNICO:**

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para realização da licitação.

Local e Data

Assinatura e Qualificação do Representante Legal

Obs.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado.



## ANEXO VIII

### CONCORRÊNCIA – EDITAL Nº 05.014/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE/CE

#### MINUTA DO CONTRATO

**TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E DO OUTRO LADO A EMPRESA ....., PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

**O MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE**, com sede na Rua Deocleciano Aragão, nº 15, Centro, Novo Oriente/CE, inscrito no CNPJ sob o nº ....., a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado por seu Secretário de Infraestrutura, o Sr. ...., inscrito no CPF nº ....., no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e a empresa ....., com sede na Cidade de ....., Estado do ....., à Rua/Av. .... neste ato representada pelo Sr. ...., Nacionalidade, Estado Civil, Profissão, inscrito no CPF nº ....., a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com a **CONCORRÊNCIA – EDITAL Nº 05.014/2022**, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1-O presente contrato tem por objeto a execução de serviços de .....

2.1-Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da **CONCORRÊNCIA – EDITAL Nº 05.014/2022** e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

2.1-A execução dos serviços terá início no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da Ordem de Serviço, a ser emitida pela Secretaria de Infraestrutura.

2.2-A execução será sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço global, com medições parciais mensais, considerando-se os preços totais.

2.3- O prazo para execução dos serviços são de 210 (duzentos e dez dias), a contar da Ordem de Serviço

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3.1-O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.



**Parágrafo Único.** O prazo supracitado poderá ser prorrogado, excepcionalmente, nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei 8.666/93.

#### **CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO**

- 4.1. O valor global do contrato é de R\$..... ( ).
- 4.2-Os elementos que compõem o cálculo do referido preço estão representados na respectiva proposta da contratada que passa a constituir parte integrante deste contrato.
- 4.3-Os preços estabelecidos neste contrato são fixos e irrevogáveis pelo prazo do período do contrato, salvo mudança na Política Econômica, quando será utilizado para reajuste o INCC-IGV ou outro índice que o substitua, determinado pelo Governo Federal, para restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro, o que faculta Termo Aditivo ao contrato.
- 4.4-A mudança superveniente da política econômica adotada pelo Governo Federal, no tocante a preços, reajustamento ou outra qualquer condição que repercuta na execução do presente contrato, deverá ser ao mesmo, adaptada mediante o competente aditamento.

#### **CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO**

- 5.1-Para efeito do recebimento o licitante deverá entregar na Secretaria de Infraestrutura a nota fiscal, juntamente com a medição mensal.
- 5.2-O pagamento da medição da Taxa de Administração Local será proporcional à execução da obra.
- 5.3-As notas fiscais recebidas serão pagas em até 30 (trinta) dias, a contar da data de seu protocolo.
- 5.4-Para efeito do contido no Artigo 40 inciso XIV alínea "d" da Lei nº 8.666/93, após requerimento do contratado, fica estabelecido que os pagamentos efetuados em atraso pela CONTRATANTE serão monetariamente corrigidos pelo INCC-IGV, levando-se em consideração a variação deste índice entre o mês do vencimento da prestação e o efetivo pagamento.
- 5.5-O Município reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o serviço não estiver sendo executado de acordo com a especificação apresentada e aceita.
- 5.6-Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal de serviços deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, em original ou em fotocópia autenticada, correspondentes a todos os empregados da obra, com os apontamentos das quantidades efetivamente executadas, conforme medição.
- 5.7-Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais ou da execução dos serviços, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

#### **CLAUSULA SEXTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

6.1-As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

| <b>ÓRGÃO</b> | <b>DOTAÇÃO</b> | <b>ELEMENTO DE DESPESAS</b> | <b>FONTE</b> |
|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|
|              |                |                             |              |





## **CLAUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E DIREITOS DAS PARTES**

### **7.1-DA CONTRATANTE**

- 7.1.1-Permitir o livre acesso dos empregados da contratada ao local do serviço;
- 7.1.2-Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico da contratada;
- 7.1.3-Acompanhar e fiscalizar o andamento do serviço, por intermédio da Unidade fiscalizadora da Secretaria de Infraestrutura do Município.
- 7.1.4-Autorizar quaisquer outros serviços pertinentes ao serviço principal, decorrentes de imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido à Secretaria de Infraestrutura e formalização pela Assessoria Jurídica do Departamento de Licitações e Contratos.
- 7.1.5-Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pela Secretaria de Infraestrutura do Município ou com as especificações constantes do edital e de seus anexos;
- 7.1.6-Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes do edital e seus anexos;
- 7.1.7-Atestar as faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio da Unidade fiscalizadora da Secretaria de Infraestrutura do Município, especialmente designada para esse fim.

### **7.2-DA CONTRATADA**

- 7.2.1-Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço, tais como:
  - 7.2.1.1-salários;
  - 7.2.1.2-seguros de acidente;
  - 7.2.1.3-taxas, impostos e contribuições;
  - 7.2.1.4-indenizações;
  - 7.2.1.5-vale-refeição;
  - 7.2.1.6-vale-transporte; e
  - 7.2.1.7-outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
- 7.2.2-Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do Município, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o Ente;
- 7.2.3-Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do Município;
- 7.2.4-Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Secretaria de Infraestrutura;



7.2.5-Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do serviço;

7.2.6-Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados quando da execução do serviço ou no recinto do Município;

7.2.7-No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Secretaria de Infraestrutura, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento do serviço.

7.2.8-Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;

7.2.9-Comunicar à Secretaria de Infraestrutura, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

7.2.10-Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

7.2.11-Submeter à aprovação da Unidade de fiscalização da Secretaria de Infraestrutura, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

7.2.12-Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta CONCORRÊNCIA.

7.2.13-Cumprir com todas as demais obrigações constantes do projeto básico, relativas a cada serviço executado.

7.2.14-Manter no canteiro de obras, o livro de ocorrências "diário de obra", preenchido e assinado pelo engenheiro responsável da obra.

7.2.15-Para todo concreto e aço das estruturas (canal ou prédios), coletar Amostras (aço) e moldar corpo de prova (concreto). Para controle de quantidades destes materiais de acordo com normas da ABNT.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS**

8.1-À contratada caberá, ainda:



8.2-Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município;

8.3-Assumir também a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do Município;

8.4-Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas ao serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

8.5-Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta CONCORRÊNCIA.

8.6-A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Município, nem poderá onerar o objeto desta CONCORRÊNCIA, razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva para com o Município.

#### **CLAUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS**

9.1-Deverá a contratada observar, também, o seguinte:

9.1.1-É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município durante a execução dos serviços mencionados;

9.1.2-É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca desta CONCORRÊNCIA, salvo se houver prévia autorização da Administração;

9.1.3-É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta CONCORRÊNCIA.

9.2-A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela Administração do Município.

#### **CLAUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

10.1-Caberá à contratada providenciar, junto ao CREA/CE ou CAU, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica-ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente.

10.2-O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a contratada e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório.



### **CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ATESTAÇÃO**

11.1-A atestação referente ao serviço caberá à Unidade de fiscalização da Secretaria de Infraestrutura do Município, ou servidor designado para esse fim.

### **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO**

12.1-A contratada deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração do Município, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário.

12.2-A FISCALIZAÇÃO do cumprimento do contrato caberá a Prefeitura Municipal de NOVO ORIENTE.

12.3-Ficam nomeados os seguintes servidores como fiscais do contrato: ....., CREA ....., MAT.: ..... como fiscal responsável para acompanhamentos dos serviços – RT;

12.4-As medições referentes à obra executada deverão conter obrigatoriamente a assinatura do Engenheiro Civil responsável pela fiscalização da execução da obra.

12.5-Verificando a ocorrência de irregularidade na execução dos serviços, a Prefeitura Municipal de NOVO ORIENTE cumprirá aplicar as penalidades cabíveis.

12.6-As “Ordens de Início de Serviço” e toda a correspondência referente ao contrato deverão ser feitas por ofício. Na hipótese de a CONTRATADA se negar a assinar o recebimento do ofício no competente livro de carga, o mesmo será enviado pelo correio, registrado, cumprido os requisitos legais.

12.7-A CONTRATADA se obriga a permitir, ao pessoal da FISCALIZAÇÃO livre acesso a todas as suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativos às máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quanto for solicitado, todos os dados e elementos referentes aos serviços.

12.8-As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante da Secretaria de Infraestrutura do Município deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.9-Compete à **Secretaria de Infraestrutura**, o acompanhamento e controle de execução do Contrato, bem como as expedições das autorizações de serviços, competindo-lhe, ainda, aprovar as medições e atestar as Notas Fiscais/Faturas para fins de pagamento.



### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS**

13.1-No interesse da Administração, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido, conforme disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

13.2-A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

13.3-Qualquer acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, no interesse da administração.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES**

14.1-O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a contratada à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.

14.2-Pela inexecução total ou parcial do objeto desta CONCORRÊNCIA, a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada as seguintes sanções:

14.2.1-Advertência;

14.2.2-Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

14.2.3-Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

14.2.4-Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração do Município pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

14.3-Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do Município e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

14.4-Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela Administração, em relação a eventos potencialmente lesivos, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.



14.5-As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

#### **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES**

15.1-A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

15.2- Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

15.3-A rescisão do contrato poderá ser:

15.3.1-Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

15.3.2-Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; e,

15.3.3-Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

15.3.4-A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

15.3.5-A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

#### **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO**

16.1- Após concluído, o serviço será recebido provisoriamente pela Secretaria de Infraestrutura do Município, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes. A Secretaria de Infraestrutura poderá contestar o recebimento, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contado do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela contratada.

16.2-O recebimento definitivo do serviço será efetuado por Comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.

16.3-O serviço somente será considerado concluído e em condições de ser recebido, após cumpridas todas as obrigações assumidas pela contratada e atestada sua conclusão pela Secretaria de Infraestrutura.

#### **CLAUSULA DÉCIMA-SETIMA – DO REGIME LEGAL**

17.1-O presente contrato reger-se-á pelas normas constantes da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, e ainda pelo edital respectivo, sendo decorrente de processo licitatório modalidade **CONCORRÊNCIA – EDITAL Nº 05.014/2022**. Todos



PREFEITURA DE  
**NOVO ORIENTE**



os documentos apresentados pelo Contratado integram este instrumento independentemente de transcrição.

#### **CLAUSULA DÉCIMA-OITAVA - DAS ALTERAÇÕES**

18.1-O presente contrato poderá ser alterado, conforme hipóteses previstas na lei 8.666/93, por Termo Aditivo, desde que haja interesse da Administração, com a apresentação de justificativa.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-NONA - PUBLICAÇÃO**

19.1-A contratante fará a publicação do resumo deste contrato no Imprensa Oficial do Município para os efeitos legais previstos na legislação pertinente.

#### **CLAUSULA VIGÉSIMA - DO FORO**

20.1-As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Novo Oriente/CE, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim ajustadas, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Novo Oriente/CE, ..... de ..... de 2022.

Secretaria de Infraestrutura  
CONTRATANTE

Nome Representante Legal  
Razão Social  
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**
